



MEMO

To : 啟晴邨及紅磡邨二期地盤


From: 房屋工程部

Ref : CSHK/DBC/GL/2016/136

關於《房屋署食水喉安裝工程物料管理風險評估工作指引》的通知

為加強對房屋署食水喉安裝工程的物料管理，按照 ISO 31000 的要求，現制定《房屋署食水喉安裝工程物料管理風險評估工作指引》，請地盤必須貫徹落實執行，從而提升地盤整體物料管理的水平。

房屋公司聯同質量技術部將於 2016 年 11 月上旬進行內審，BSI 亦將於 2016 年 12 月進行外審，確保上述物料風險管理工作均能落實到位。



二零一六年十月十七日

(附件)

抄報： 公司領導 – 黃副總、劉副總 (電郵傳達)

抄送： 質量技術部、安全環保部、物資部、信息化管理部、房屋工程部傳閱

THS/AT/WP/at
Lp LP



中國建築工程(香港)有限公司

CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING (HONG KONG) LTD.

房屋署食水喉安裝物料管理 風險評估工作指引

版本： 第一版

日期： 2016 年 10 月

目 錄

1. 適用範圍
2. 風險管理政策
3. 風險管理組織架構及職責描述
4. 風險確定(risk identification)
5. 風險分析及評估(risk analysis and evaluation)
6. 風險處理措施(risk treatment)
7. 風險措施監控、覆核及記錄(monitors, review and recording)

1. 適用範圍

本指引適用於香港地區房屋署「啟晴邨」及「紅磡邨二期」更換食水喉工程有關食水喉安裝物料的風險管理。

2. 風險管理政策

中國建築工程(香港)有限公司
(房屋工程部)

房屋署食水喉安裝工程
物料質量風險管理政策

中國建築工程(香港)有限公司房屋工程部為加強對房屋署食水喉安裝工程的物料管理，按照ISO31000的要求，制定有關物料風險管理工作程序及措施，落實做好有關食水喉物料的監控，減少或杜絕任何有關之潛在風險，竭誠為業主及公眾提供優質的食水喉工程。

本政策適用於啟晴邨及紅磡邨二期食水喉更換工程，公司所有有關員工必須遵照執行，並對有關風險管理工作認真負責。

本公司將會不斷地檢討和完善有關之物料質量監控風險管理制度，持續提升該等工程對物料管理的優質表現。




宋增雄

房屋工程部 總經理

二〇一六年九月一日

3. 風險管理組織架構及職責描述

3.1 組織架構表

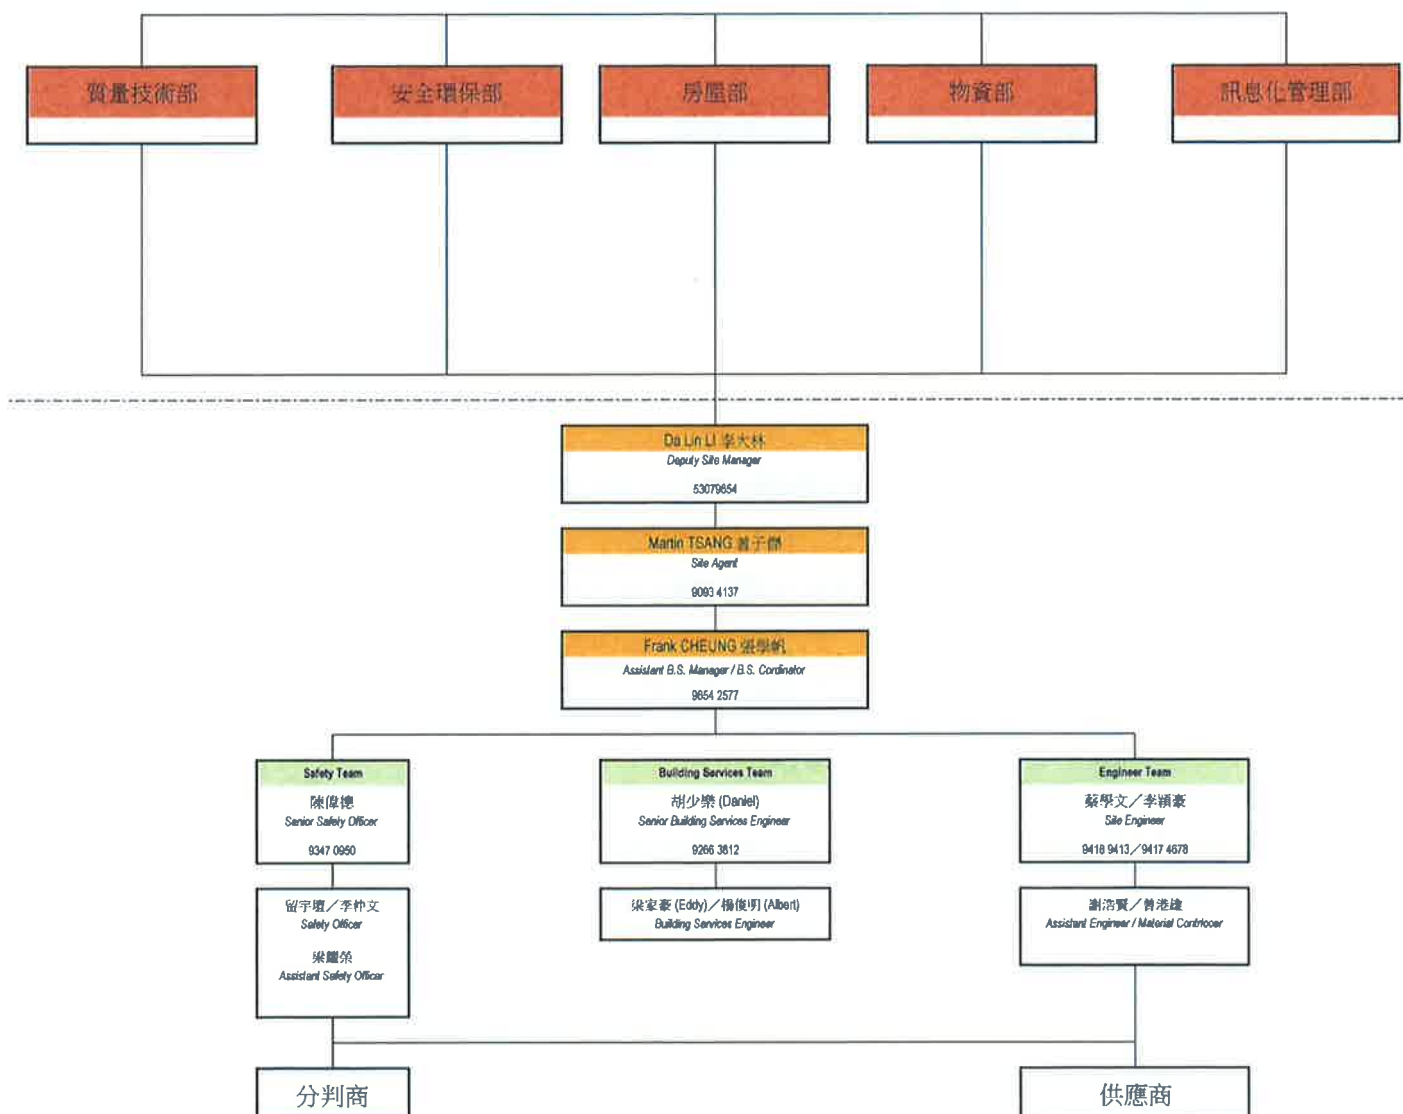

3.2 職能部門職責描述

房屋工程部

- 協調各部門及地盤的相關工作和溝通；
- 協助建立並推動地盤落實執行食水喉更換工程物料質量風險管理制度及措施；
- 定期監控地盤有關物料質量風險管理工作落實情況，並檢討成效。

質量技術部

- 協助建立及推動地盤落實執行食水喉更換工程物料質量風險管理制度及措施；
- 定期審核及監控地盤有關物料質量風險管理工作情況，並提出改善建議。

安全環保部

- 貫徹執行公司安全及環保管理工作，協助地盤建立高標準的安全、健康及環保的工作環境；
- 定期進行評估並檢討有關工程物料對安全、健康及環保的危害和風險；
- 定期監控地盤有關物料安全及環保的風險管理工作，並提出改善建議。

物資部

- 貫徹執行公司綜合管理政策，致力達成既定質量、安全及環保管理目標，並不斷發揮持續改進精神；
- 按公司標準工作程序的要求，做好物資採購各項風險評估的工作，制定監控措施，並定期檢討成效。

信息化管理部

- 利用信息化技術，協助建立及推動地盤落實電子化工作流程，改善更換工程物料時的質量風險；
- 定期監察系統資料的完整性和準確性管理，並提出改善建議。

3.3 地盤員工職責描述

3.3.1 Site Manager (地盤經理) / Deputy Site Manager (地盤副經理)

- 1) 確保執行公司物料風險管理政策。
- 2) 分配資源及指派人員按制定的框架編制及落實物料風險管理的評估及相應措施，並確保措施正常運行。

3.3.2 Project Manager (工程經理) / Site Agent (地盤代表)

- 1) 執行公司物料風險管理政策的要求。
- 2) 牽頭編制物料風險管理的措施及分工表。
- 3) 統籌本《房屋署食水喉安裝工程物料管理風險評估工作指引》的施工管理、檢驗和試驗工作程序及有關工作的安排和分配，持續改善及有效運作本工作指引。
- 4) 統籌相關部門及人員定期檢討措施落實情況及按需要更改。
- 5) 代表公司與業主聯絡協調物料風險管理的工作。

3.3.3 B.S Coordinator (技術顧問)

- 1) 就更換水喉的相關物料提供技術意見,以協助編制物料風險管理的評估及相應措施。
- 2) 與物料供應商及分判商聯絡交換技術意見。
- 3) 於制定施工方案時融入物料風險管理的框架。

3.3.4 B.S Team (屋宇設備工程部)

- 1) 協助制定更換水喉工程之施工方案,及協助編制物料風險管理計劃。
- 2) 編制物料訂購計劃表時確定物料已符合審批要求。
- 3) 負責審批分判商的物料提貨申請。
- 4) 監管現場施工工藝及物料是否根據施工方案進行。
- 5) 更新工程上資訊及保持與持牌水喉匠(LP)聯絡。
- 6) 協助 LP 培訓工人。

3.3 地盤員工職責描述(續...)

3.3.5 Foreman Team (現場監工)

- 1) 直接監管現場施工，包括質量、安全及環保等工作。
- 2) 監管工人施工工藝及物料是否根據施工方案進行。
- 3) 將現場施工之問題轉達屋宇設備工程部及解決問題。

3.3.6 Safety Team (安全事項)

- 1) 負責分判商打理及工人新入職培訓及定期培訓。
- 2) 制定物料風險管理上的安全及環保風險評估及措施。

3.3.7 Engineering Team (中央行政支援 /物料中央管理)

- 1) 負責物料驗收程序。
- 2) 負責物料儲存程序。
- 3) 負責物料分發。
- 4) 監管現場施工之物料是否根據施工方案進行。

3.3.8 Sub-contractor and Plumbers (水喉分判商及工人)

- 1) 根據現場管工指示進行水喉安裝及更換工作。
- 2) 需自行檢查已完成的喉管工作。
- 3) 依照地盤制定的制度執行相關工序，包括指差呼稱及工作許可證制度。
- 4) 與屋宇設備工程部同事協調訂貨數量。
- 5) 向管工及屋宇設備工程部回報有關任何技術及施工上的問題。
- 6) 參與地盤提供的技術，安全及工作意識等培訓。
- 7) 就施工角度向屋宇設備工程部提供專業意見。

3.3.9 Licensed Plumber (持牌水喉匠)

- 1) 負責提交水務署處所需之表格。
- 2) 更新工程資訊及保持與水務署聯絡。
- 3) 聯合 COW 及中建檢查物料及施工程序。
- 4) 保持與公司屋宇設備工程部聯絡。
- 5) 檢查工場及現場之物料是否正確。
- 6) 檢查工場及現場施工程序是否正確。
- 7) 講解最新水喉施工程序及物料要求給分判商打理及工人。

3.3 地盤員工職責描述(續...)

3.3.10 Supplier (供應商)

- 1) 負責提供符合水務署規格之水喉材料。
- 2) 負責提交水喉材料所需之文件及報告。
- 3) 就更換水喉的相關物料提供專業意見，以協助編制物料風險管理的評估及相應措施。

4. 風險確定

列出主要與物料相關的風險問題，如違反合約，功能問題，安全問題，健康問題及工程進度；並列出對應的引致風險發生的原因，如經濟效益，省力，逃避檢查，缺乏認識，缺乏技能，記錄不足，新材料等。

5. 風險分析及級別評估

建議地盤列出物料之清單，分別針對風險問題嚴重性及其誘因引發風險發生的機會率進行作“大至小”評估，從而評估有關項目之風險級別。

例(供參考):

錫焊料風險評估:

發生的機會率(L)	低(1)	中(2)	高(3)
經濟效益			3
省力		2	
逃避檢查			3
缺乏認識			3
缺乏技能		2	
記錄不足			3
新材料	1		
總分			17
	7-10	11-14	15-21
級別			3

嚴重性(C)	小(1)	中(2)	大(3)
違反合約			3
功能問題	1		
安全問題			3
健康問題			3
工程進度		2	
總分			12

風險級別 (L x C)	低(5-15)	中(16-30)	高(31-45)
漏水			36

按以上評估，錫焊料屬於“高級”風險。地盤須因應問題級別制定相應監控措施。

6. 風險處理措施

按質量風險之大小，地盤對現行物料管理進行檢討，改善及制定相應措施。檢討範圍從訂料，到貨，儲存到分發物料的工序及監管。檢討現行措施是否足夠，需否加強現有措施或增加新措施，並將相應改善措施落實，明確負責人員，以消除或減低質量風險。

如檢討後發現以上改善措施仍有不足，可從食水喉施工工序、流程方面著手加強及改善。

以上面的錫焊料為例，其風險級別為高，經檢討後發現現有的物料管理制度相當寬鬆，需作出以下加強。

加強後物料管料制度	
訂料	- 由屋宇設備工程師呈交物料文件及樣辦，以供房屋署及水務署審批。 - 待物料已批核後，由屋宇設備工程師與分判商根據工程物料需求商討需訂物料數量後，由屋宇設備工程師填寫物資申請表，並附上有關批核文件，交予總寫字樓以作訂料。
到貨	- 物料送貨到地盤需核實材料數量，質量，出廠來源地，所需之試驗報告及送貨單並與房署進行驗收。 - 地盤安排指定專人負責收貨入賬記錄。 - 同一批次之焊接料需抽取 2 個樣辦以快速測試鉛含量，或按業主之數量要求抽取樣辦以快速測試或送化驗所檢測金屬含量符合要求。
儲存	- 物料完成點貨後需存於材料倉中，鎖入指定物料倉內儲存。由專人保管鑰匙。 - 焊料需編上編號及由指定材料管理員簽名。
分發	- 每次物料取貨前，分判商打理需填寫物料申請表，並交予 BS 部同事確認，再將已簽署的物料申請表交予材料管理員取貨。 - 焊料需記錄每次出貨的編號及使用位置。且用完的空包裝需交回材料管理員註銷。

7. 風險措施監控、覆核及記錄

為加強地盤嚴格落實執行有關工作，公司有關部門及地盤成立質量風險管理工作小組，具體人員及工作如下：

7.1 工作小組成員包括：

組長：譚啟全

組員：錢國富、陸中南、劉偉漢、鮑嘉樂、葉源平、李大林、
林東海、曾子傑、張學凡

7.2 工作小組主要職責：

- 協助地盤建立和完善食水喉更換安裝工程物料質量風險管理制度及措施；
- 監控地盤有關物料質量風險管理工作落實情況；
- 定期覆核地盤有關物料質量風險管理工作成效；
- 持續改善地盤有關風險管理工作。

~ 完 ~
