

中國建築工程(香港)有限公司

標準工作程序

第四號：物資採購工作程序

編號：PRO/004

版本：第三版：A

日期：2025 年 7 月



工作程序修改記錄表

修改日期：2025.07

程序	修改內容簡要	新版
4	1. 修訂2.範圍及4.定義內容 2. 修訂5.供應商管理內容 3. 修訂6.1.1、6.1.3、6.1.6採購作業程序 4. 新增/更新表格 PRO4-01(C)、PRO4-02(C)、PRO4-04T、PRO4-04SL、PRO4-05(F)、PRO4-09(E)、PRO4-10(B)、PRO4-11EM(A)、PRO4-12 (D)、PRO4-13(D)、PRO4-15(C)、PRO4-16(A)、PRO4-17(B)、PRO4-20(D)、PRO4-21(A)、PRO4-22(D)、PRO4-23(E)	第三版 A

【同意】
批准: 黃江 2025-07-28 12:13
常務副總經理



目 錄

1. 目 的
2. 範 圍
3. 參考資料
4. 定 義
5. 供應商管理
 - 5.1 供應商名冊分類、分級與制定
 - 5.2 供應商評估
 - 5.3 供應商名冊更新
 - 5.4 對供應商的處分
6. 採購管理作業程序
 - 6.1 採購程序
 - 6.1.1 採購方案與成本
 - 6.1.2 採購原則
 - 6.1.3 發標及回標
 - 6.1.4 議價、議價會及回標
 - 6.1.5 定標決定供應商
 - 6.1.6 物資申請
 - 6.1.7 簽定《訂購合約》
 - 6.1.8 材料審批及供應商未能履約
 - 6.1.9 代分判商採購
 - 6.1.10 鋼筋採購辦法
 - 6.1.11 大宗材料採購辦法
 - 6.1.12 瓦仔、潔具、門五金、化工、機電設備材料及特殊材料採購辦法
 - 6.1.13 開辦器材、機械設備等固定資產採購辦法
 - 6.1.14 定點及零星物資採購辦法
 - 6.2 進貨
 - 6.3 驗收
 - 6.4 儲存、保養及發放
 - 6.5 物料採購風險管理



7. 附錄

附錄I 物資採購流程圖匯總

附錄II 投標之材料詢價辦法

附錄III材料報批辦法

8. 附表

PRO4-01(C) 供應商登記表

PRO4-02(C) 供應商評估表

PRO4-03 物資詢價表

PRO4-04T 報價邀請書

PRO4-04SL 邀請報價供應商名單

PRO4-05(F) 物資採購比價單

PRO4-07 訂購合約

PRO4-09(E) 物資申請表

PRO4-10(B) 地盤零星材料申請表

PRO4-11C 混凝土申請單

PRO4-11R 地盤鋼筋進場通知

PRO4-11EM(A)地盤機電材料進場通知

PRO4-12(D) 施工材料及設備採購方案

PRO4-13(D) 地盤零星材料比價單

PRO4-15(C) 供應商評估匯總表

PRO4-16(A) Quotation Inquiry Sheet

PRO4-17(B) 供應商處分會審表

PRO4-18(A) 警告信/停止投標資格

PRO4-19(A) 關於從認可供應商名冊中除名的通知

PRO4-20(D) 物資採購開標及議標記錄表

PRO4-21(A) 暫准使用供應商申請表

PRO4-22(D) 物資採購會審表

PRO4-23(E) 機械設備購置及處理會審表

1. 目的

根據工程質量、安全及健康和環保要求，選擇合適的供應商，以保證所有與工程質量、安全及健康和環保有關的物資採購能滿足業主及有關人士的要求。

2. 範圍

適用於公司及工程公司所承包工程合約所需的物資採購。公司及工程公司之物資採購均通過物資與運營部按本程序執行，如新工程合約（New Engineering Contract NEC）規定程序與本程序有矛盾時，應執行兩者中更嚴格要求。

3. 參考資料

《質量管理手冊》、《安全及健康管理手冊》、《環保管理手冊》、《文件及資料管理工作程序》。

4. 定義

參照《質量管理手冊》、《安全及健康管理手冊》及《環境管理手冊》有關名詞解釋。除特別指明外，有關的術語解釋以下面的為準：

4.1 零星材料：指可從定點供應商名冊中購買的材料。

4.2 固定資產：指使用年限超過一年，且單價為 3 千港元以上的辦公用品及單價為 1 萬港元以上的施工機械設備（器材）等資產。

4.3 標準合約條款：標準合約條款模版經中建香港商務法律部門審核後作為編制訂購合約基礎，無需每次重複審核，其中部分內容可按實際情況進行修訂（如主合約要求、送貨期、付款條件等），經物資與運營部總經理審批及簽發。

4.4 物資採購與出售：除另有規定外，工程合約所需材料、設備、固定資產、開辦器材、相關服務採購及廢舊材料設備與固定資產出售，統一經物資與運營部按本程序採購/出售。本程序不適用於以工人現場工作為主，完工後帶有工藝品質(Workmanship)、保固等責任的業務。

5. 供應商管理

5.1 供應商分類、分級管理

5.1.1 暫准使用供應商：為初始合作的供應商，需觀察其表現待表現獲充分肯定後，需按列入認可供應商名冊程序辦理；或不經常合作之認可供應商其超過 5 年未有成交紀錄，則自動轉為暫准使用供應商，如要轉正需滿足上述條件並重新按程序辦理。

5.1.2 暫准使用供應商可承接 1000 萬港元以下訂購合約。若採購員建議選用暫准使用供應商，應按表格 PRO4-21《暫准使用供應商申請表》填報，並經物資與運營部總經理批准後方可定標決策。

5.1.3 認可供應商：暫准使用供應商履約良好或經過審查、考察確認供應商綜合實力，可填報表格 PRO4-01《供應商登記表》提交申請，經物資與運營部總經理審批後提升為認可供應商並納入認可供應商名冊。認可供應商在其已批准的分類中承接訂購合約，不受金額限制，在未經審批的分類中視同暫准使用供應商。

5.2 供應商評估

5.2.1 對每年與公司有來往的供應商，地盤負責按表格 PRO4-02《供應商評估表(線上評估)》之評估準則填報，各地盤供應商之評分將匯總至表格 PRO4-15《供應商評估匯總表(線上評估)》。

5.2.2 供應商評分由 2 部份組成，地盤平均評分佔 60%，物資與運營部評分佔 40%；供應

商按評分分為 A(優秀)、B(良好)、C(一般)及 D(差劣)四級。

5.3 供應商名冊更新

5.3.1 物資與運營部定期負責對所有供應商按過去一年的表現進行全面評估，覆審並更新供應商名冊。名冊分為認可供應商名冊、暫准供應商名冊、除名供應商名冊及禁止交易企業名冊。

5.3.2 認可供應商名冊為已提交《供應商登記表》，並已獲審批、評審合格及五年內有成交記錄之供應商。

5.3.3 暫准供應商名冊為評審合格但未被納入認可供應商名冊之供應商或超過五年未有成交記錄之認可供應商。

5.3.4 被除名供應商名冊為已結業、評審不合格之供應商或超過八年未有成交記錄之認可供應商、超過三年未有成交記錄之暫准供應商。

5.3.5 禁止交易企業名冊，包括表現欠佳被暫停投標資格的供應商及上級公司要求禁止交易的企業。

5.3.6 被除名的供應商不能使用，若需恢復使用，由物資與運營部總經理批准後方可選用。

5.4 對供應商的處分

5.4.1 對於表現欠佳的供應商：出現連續未能按時、按質供貨，未能履約、違反商業道德、進地盤供貨/服務期間違反現行法定的安全及環保要求而致公司蒙受違例檢控等情況，由物資與運營部參考地盤、工程公司/部門、或相部門的意見後填寫表格 PR04-17《供應商處分會審表》，建議處分級別，由物資與運營部總經理審定，處分結果由物資與運營部書面通知供應商。

5.4.2 處分級別：按表格 PR04-18《警告信/停止投標資格》書面警告、暫停供應商投標資格、按表格 PR04-19《關於從認可供應商名冊中除名的通知》除名、停止投標資格或其它。

5.4.3 供應商被暫停投標，期滿後由採購員提供供應商改善情況報告，物資與運營部建議，然後交公司物資分管領導決定是否恢復投標資格。供應商改善情況報告重點闡述導致被暫停投標問題的改善情況和保證措施以及相應的監管方法。

6. 採購管理作業程序

6.1 採購程序

6.1.1 採購方案與成本

- a. 地盤應盡早組織按表格 PMP-5《施工材料及樣板報批計劃表》編制材料報批計劃表及填報表格 PRO4-12《施工材料及設備採購方案》，建議供應商(如合約指明品牌必須填報)，供應商名單最終由物資與運營部總經理/授權人員決定。如根據工程的進展及實際情況與原採購方案內容產生變化，地盤可從《物資申請表》的採購方案部分反映最新信息後提交物資與運營部/授權人員簽收並跟進。
- b. 在工程中標三個月內 (少於一年工期的工程項目中標一個月內)，地盤提交《施工材料及設備採購方案》予物資與運營部作為日後採購及成本管控的依據，並需定期向物資與運營部提交更新的採購方案。

6.1.2 採購原則

- a. 當工程合約對安全及健康和環保有特別要求需要進行相關物資採購時，物資與運營部可會同地盤及有關方面向供應商作出說明，並在合約中列出相

關的特別條款及條件。對於合約無特別要求的物資，採購員要兼顧貨物品質及交貨中的安全及健康和環保因素(如噪音、能源消耗、揚塵、廢氣、廢料、化學品等)，在對此作出評價的基礎上選擇合適供應商，採購較為安全及健康和環保的產品。

- b. 若工程合約規定公司需協助業主在貨源地、收貨地或工作現場進行檢驗時，地盤經理應盡早提出，以便物資與運營部在邀請供應商報價時能作出相應的規定來滿足業主檢驗的要求。

6.1.3 發標及回標

- a. 發標準備：地盤應提前將材料報批詢價申請連同相關合約要求 / 《物資申請表》提交予物資與運營部。
- b. 物資與運營部收齊地盤資料後，採購員須在認可供應商名冊內選取最少 3 家供應商會同地盤建議名單(如有)，並按表格 PRO4-04《報價邀請書》或 PRO4-16《Quotation Inquiry Sheet》及 PRO4-04SL《邀請供應商報價名單》編制報價邀請及建議邀請供應商名單，由物資與運營部總經理或授權人員決定名單並簽發。除採購額在 5 萬港元以下，採購員可用電話邀請報價外，其他金額的報價邀請一律須以書面方式發標。
- c. 若採購員要選用尚未進入認可供應商名冊的供應商，應按表格 PRO4-21《暫准使用供應商申請表》填報，並經物資與運營部總經理/授權人員批准後方可定標決策。
- d. 機電項目設備材料，10 萬港元以下由機電地盤按本程序第 6.1.2-6.1.5 處理，10 萬港元以上由物資與運營部按程序處理。
報價單處理：
- e. 採購額 1000 萬港元以下的報價單，以電郵方式傳達。
- f. 採購額 1000 萬港元以上的報價單，正本報價單須密封後投入“投標箱”，由採購員連同物資與運營部總經理或副總經理/授權人員共同開標。
- g. 供應商如未在規定時間內回標則視為棄標，無需供應商提供棄標函，但需做好記錄。

6.1.4 議價、議價會及回標

- a. 採購額 1000 萬港元以下 (機械設備單機價格 100 萬港元以下)，由物資與運營部總經理決定是否需要召開議價會，如不需要召開議價會，由採購員進行議價。
- b. 採購額 1000 萬港元以上 (機械設備單機價格 100 萬港元以上)，必須召開議價會，並需按表格 PRO4-20《物資採購開標及議標記錄表》做好會議紀錄。
- c. 議價後，如需要回標，回標方式按本程序第 6.1.3 (g)處理。

6.1.5 定標決定供應商

- a. 定標決定供應商的準則是在同等條件下，優先選用最低價者；若價格亦相同，則再優先選用商譽、服務表現和供貨經驗居佳者(商譽、服務表現參考年度供應商評估結果，供貨經驗參考其工程記錄)。對於非最低價中標或主合約指定唯一供應商供貨的，需在定標文件中說明原因。
- b. 採購額在 1000 萬港元以下(機械設備單機價格 100 萬港元以下)，由採購員建

議必要時徵詢有關工程公司/部門及地盤意見，按公司授權經物資與運營部按表格 **PR04-05**《物資採購比價單》集體決策。

- c. 採購額在 1000 萬港元以上(機械設備單機價格 100 萬以上)，由物資採購決策委員會或機械設備購置及處理決策委員會按表格 **PR04-22**《物資採購會審表》或 **PR04-23**《機械設備購置及處理會審表》綜合比較各種因素後決定供應商。

6.1.6 物資申請

- a. 對於需要呈交樣板報批的材料，地盤需提交 **PRO4-09**《物資申請表》並選項樣板報批詢價，該申請表必須填寫清楚，並盡可能包括下列各項內容：物資名稱、規格、型號、數量、要求進貨日期、預算金額、邀請報價供應商(如合約指明品牌必須填報)、技術要求、適用於該項物資的質量、安全及健康和環保認證要求等資料，預留足夠的採購及樣板報批時間，提前交物資與運營部按程序處理。
- b. 地盤有關人員應根據工程進度、物資採購定標會決定及業主代表審批情況按表格 **PRO4-09**《物資申請表》編制電子《物資申請表》，經地盤經理審批後，物資與運營部採購員進行簽收。地盤應參照 6.1.6.a.已提交樣板報批詢價物資申請的進貨計劃，預留足夠進貨時間，提前作出物資申請。
- c. 對於無需進行樣板報批的材料，地盤可編制電子《物資申請表》提交予物資與運營部跟進。

6.1.7 簽定《訂購合約》

- a. 採購員根據《物資申請表》的要求按表格 **PRO4-07**《訂購合約》編制《訂購合約》。訂購的物資須與《比價單》/《物資採購會審表》/《機械設備購置及處理會審表》內容相符。
- b. 所有合約條款均需經中建香港商務法律部門審核，其中標準合約條款無需重複審批。採購員要把《訂購合約》交物資與運營部授權人員審核後，由物資與運營部總經理或授權人員簽發。
- c. 簽約前，供應商須認可所有與其有關的合約要求以及工作程序中與之有關的條款，並保證遵照執行。
- d. 《訂購合約》簽定後，如有任何修改，地盤需以書面通知有關採購員，由物資與運營部與供應商協商修訂內容，並得物資與運營部總經理批准後辦理合約變更手續。補充訂貨單按本程序第 6.1.2-6.1.6 辦理，原則上採用原合約供應商。
- e. 物資與運營部要把供應商簽回的合約，連同《物資申請表》及《比價單》按《文件及資料管理工作程序》要求，按地盤分類存檔。地盤如需要有關副本時，可於公司內聯網內取閱。

6.1.8 材料審批及供應商未能履約

- a. 對於需向業主報批的材料，地盤應盡早提交材料報批詢價申請，物資與運營部按本程序第 6.1.2-6.1.5 要求定標後，地盤正式向業主報批。
- b. 如材料不獲業主審批或供應商未能履約，要重新議價及定標。

- c. 對未能履約供應商的處分，按本程序第 5.4 處理。


6.1.9 代分判商採購

- 分判商需向地盤提交代購材料申請書。
- 由分判商包工包料，分判合約訂明由公司供應/代購材料，地盤提交的《物資申請表》須同時提供相關分判合約條款。
- 凡分判合約未有訂明由公司供應/代購材料，地盤提交的《物資申請表》須要經有關工程公司/部門合約科負責人審批；
- 地盤必須提供代分判商採購項目之 BQ 總數量，且須負責控制分判商申請之數量與實際用量(連約定損耗)相符以及必須按期扣回代購款項；
- 採購員收集和核對相關資料後按本程序第 6.1.2 至 6.1.7 處理。

6.1.10 鋼筋採購辦法

以統一採購方式，物資與運營部綜合地盤需求數量統一與供應商簽訂通用合約，之後按地盤的進貨計劃進行分派，由地盤向供應商發出訂貨單 送貨。

採購流程：

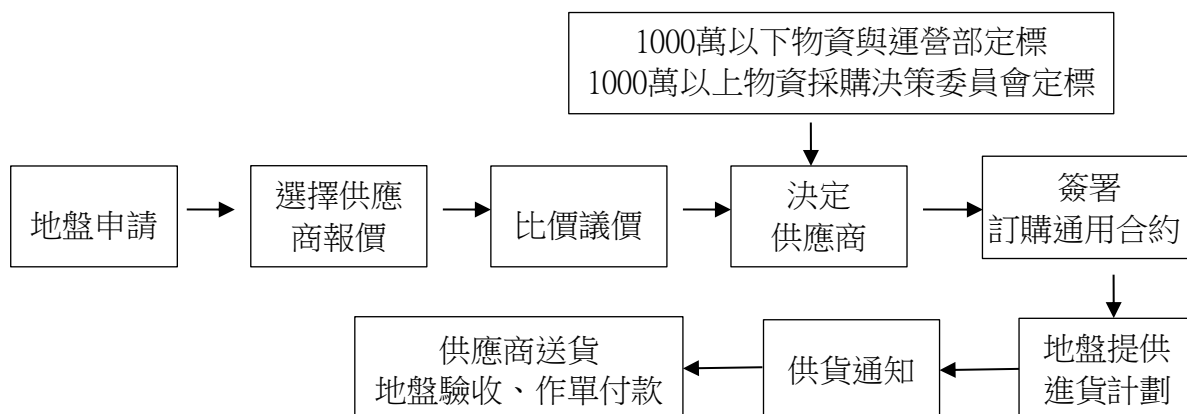


6.1.11 大宗材料採購辦法

- a. 材料種類：

工字樁、鋼筋網、型鋼、閘板、石矢、沙漿、石料、石矢製品等

- b. 採購流程：

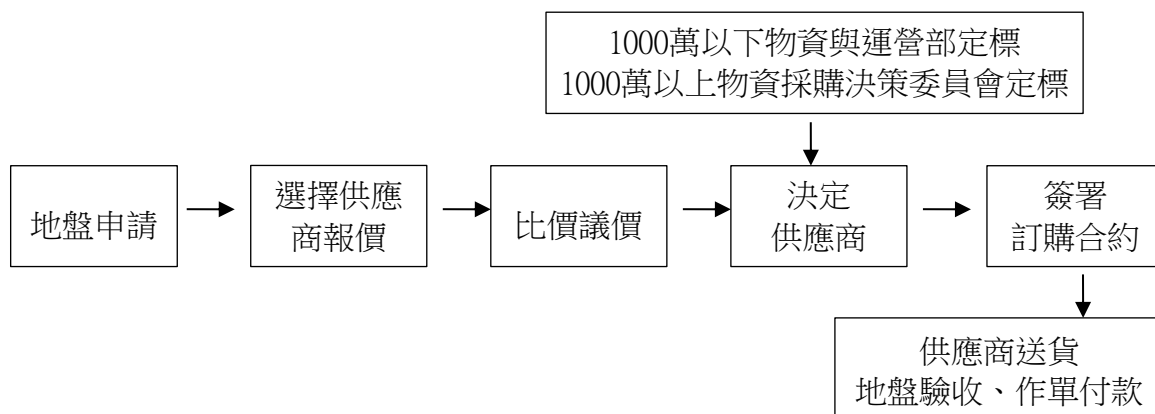


6.1.12 瓦仔、潔具、門五金、化工、機電設備材料及特殊材料採購辦法

a. 材料種類:

瓦仔、紙皮石、花崗石、大理石; 浴缸、面盆、座廁、龍頭、花灑、星盆; 門鎖、氣鼓、拉手、門鉸; 瓦仔膠、密縫膠、白膠漿、土工布、止水帶、啤咭膠、伸縮縫、水務喉管、機電設備材料及其它特殊材料。

b. 採購流程:

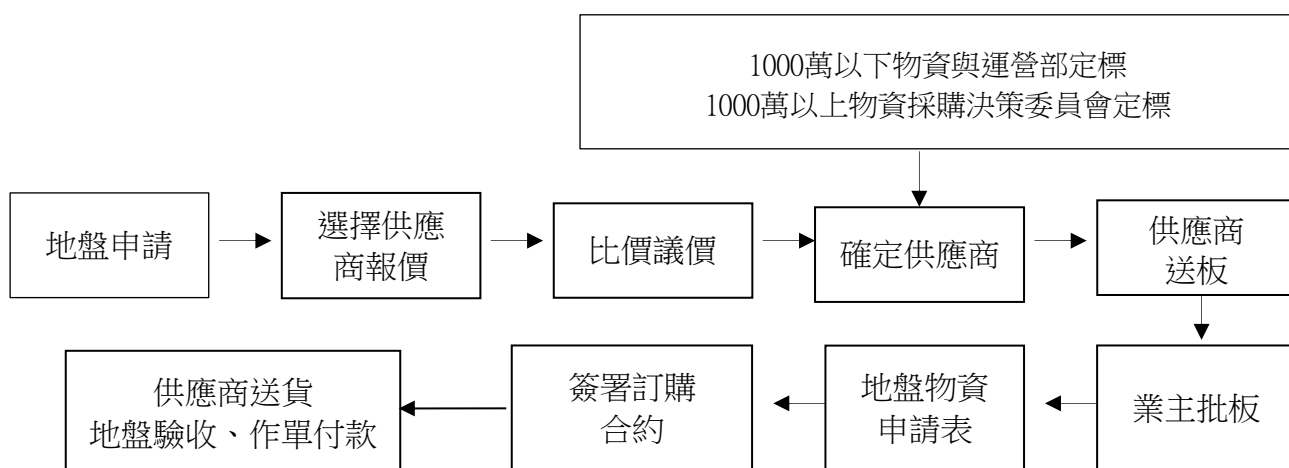


6.1.13 開辦器材、機械設備等固定資產採購辦法

a. 產品種類:

汽車、影印機、照像機、攝像機、傳真機、對講機、過膠機、電話、貨櫃、看更亭、流動廁所、環保缸、洗車機、危險品倉、地盤保安系統(掌形機、閉路電視、電動車閘)、測量及試驗儀器、施工機械設備等

b. 採購流程:

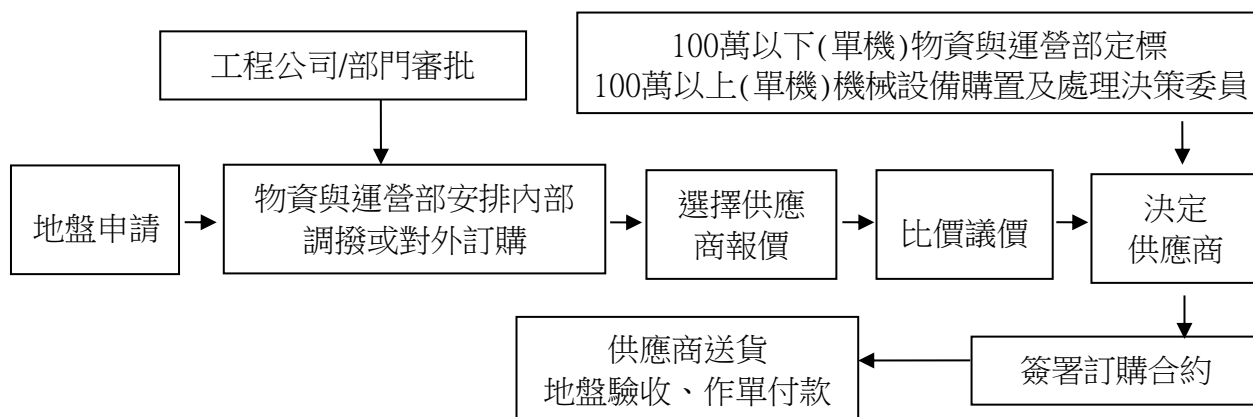


6.1.14 定點及零星物資採購辦法

a. 物資種類:

油渣、小五金及什項、吊運/起重機/發電機租賃、電器材料、安全用品、海報宣傳用品、施工機具、吊重工具、電動工具、砂石料、英泥、五星泥及膨脹膠、白膠漿、石矢慢干劑、止水帶、蔗渣板及密縫膠、潤滑油、批盪網、辦公傢俱、文儀用品等。

b. 採購流程:

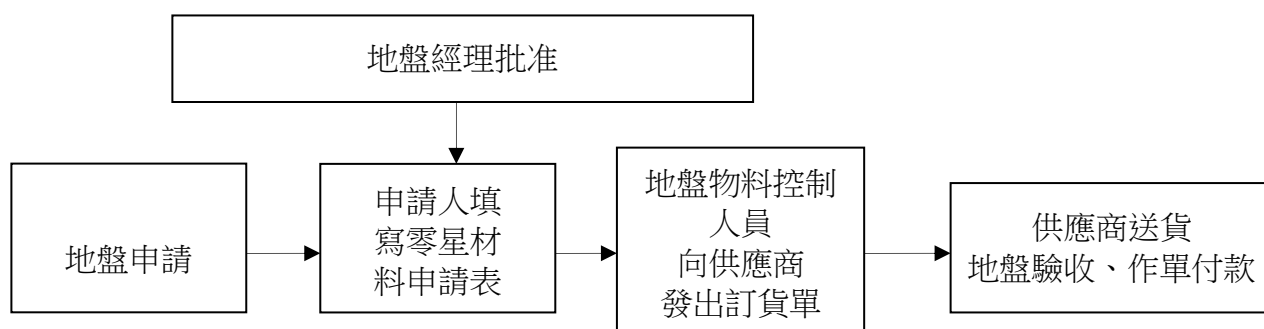

(a) 申請方式

申請人填寫表格 PRO4-10《零星材料申請表》報地盤經理審批，然後交物料控制人員辦理並存檔。

(b) 供應商的選用和訂購

零星材料中如屬定點材料可從定點供應商名冊中挑選供應商，但金額超過 20 萬港元時須交物資與運營部採購。非定點材料，則由物料控制人員選擇幾家信譽好、品質優、送貨及時的供應商議價，然後按表格 PRO4-13《地盤零星材料比價單》做比價單，并提出選用供應商建議，經地盤經理審定才可通知供應商送貨；但貨價超過 5 萬港元時仍需通過物資與運營部採購。

6.2 進貨

6.2.1 地盤物料控制人員要掌握採購合約中各項材料的供貨時間，督促供應商按時送貨，並及早通知地盤經理或總管，以便做好存倉準備。

6.2.2 訂購合約寫明按訂貨單分批送貨的材料：

- 鋼筋由物料控制人員按《訂購合約》或《供貨通知》的要求填寫表格 PRO4-11R《地盤鋼筋進場通知》提前向供應商發出訂貨單。《地盤鋼筋進場通知》上的負責人簽字要與簽字樣本相符。
- 石矢由物料控制人員提前 3-7 天向供應商發出訂貨單，之前管工要填寫表格 PRO4-11C《混凝土申請單》交物料控制人員存檔。
- 通用標準機電材料以暫定數量(Provisional Quantity)形式製定《訂購合約》，相關材料由地盤指定人員按《訂購合約》的要求填寫表格 PRO4-11EM《地盤機電材料進場通知》提前向供應商發出訂貨單。《地盤機電材料進場通知》上的負責人簽字要與簽字樣本相符。

6.2.3 如供應商未能按時供貨，物料控制人員要立即通知地盤經理及物資與運營部經辦採購員，以便向供應商交涉解決。

6.3 驗收

採購物料的接收、檢驗、試驗和不合格品的處理要按《施工管理、檢驗和試驗工作程序》執行，以保證滿足工程合約要求。

6.4 儲存、保養及發放


採購物料的儲存、保養及發放要按《施工管理、檢驗和試驗工作程序》執行，以保證滿足工程合約要求。

6.5 物料採購風險管理

物資與運營部定期對主要材料之價格、項目上之需求及市場之供求等風險進行分析評估、編制相關報告、跟進及監控措施。




6. 附錄 I: 物資採購流程圖匯總:

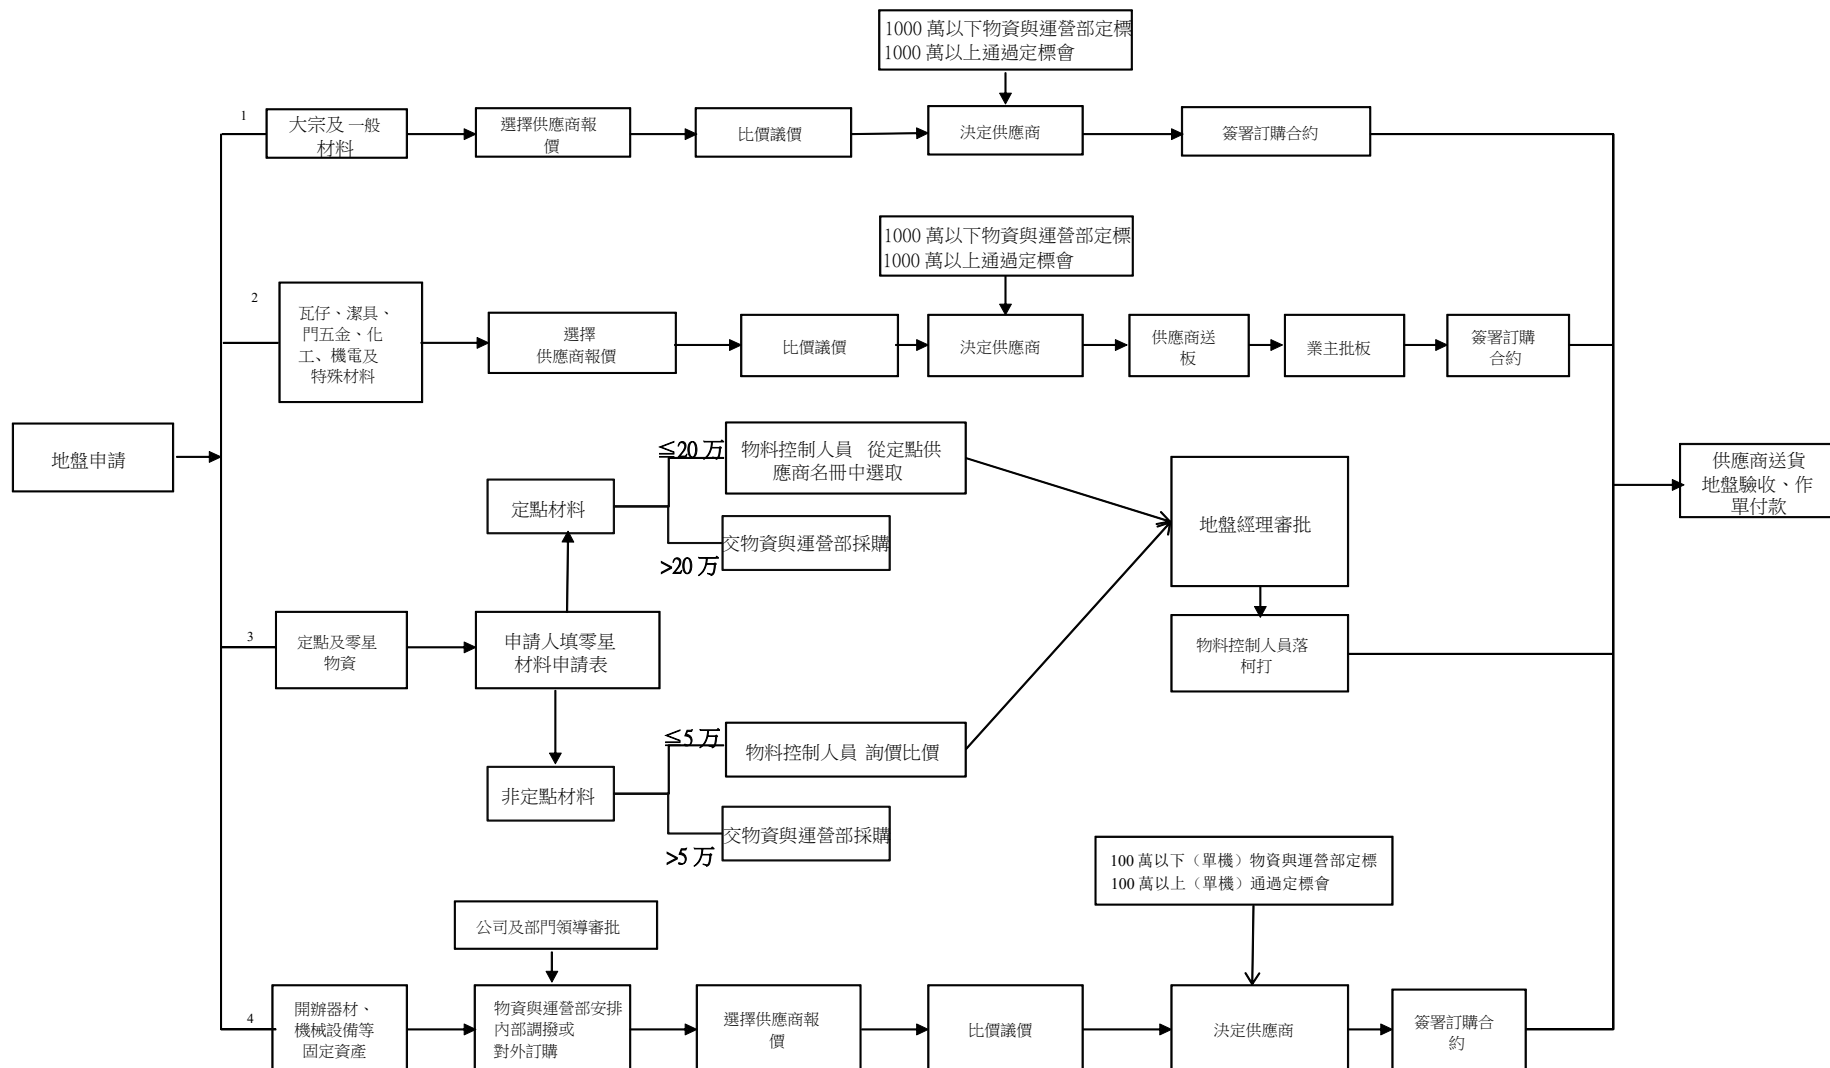

附錄 II. 投標之材料詢價辦法

- (a) 當投標工程所需 1000 萬港元以上材料時，工程公司/部門投標科應將表格 PRO4-03 《物資詢價表》及有關資料，分類交物資與運營部主辦採購員詢價。
- (b) 採購員向若干個供應商詢價。
- (c) 供應商收到資料後如有疑問，採購員與投標估價科負責人應解答材料商問題或安排會議直接解答材料商的問題。
- (d) 報價單收齊後，由採購員轉交投標估價科。
- (e) 對於鋼筋、混凝土、型材、沙石料等對投標總價影響較大的大宗材料，若有關工程公司/部門認為需要簽標前採購協議時，需按表格 PRO4-09 填寫《物資申請單》，并按本程序第 6.1.2 至 6.1.5 處理。物資與運營部秘書負責將標前採購協議按投標工程項目存檔，並拷貝後送投標估價科。當投標工程中標後，採購員可根據有關協議直接與供應商履約。

簽署標前採購協議流程圖

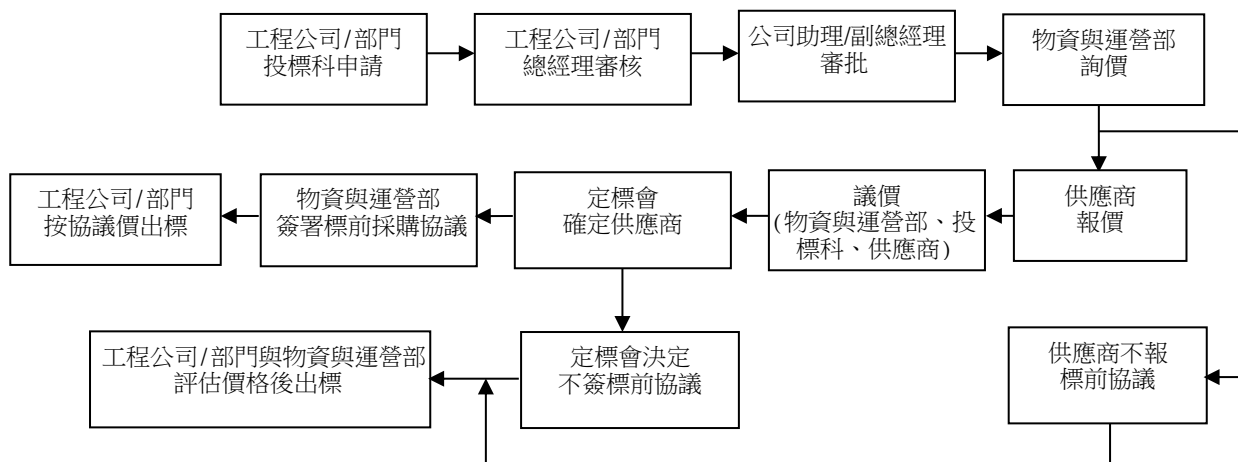



附錄III. 材料報批辦法

- (a) 採購員通知供應商送樣板及有關資料，包括物料及安全資料(Material Safety Data Sheet 簡稱 MSDS)到物資與運營部或地盤寫字樓。如對需提供 MSDS 的材料範圍有任何疑問，可諮詢安環部。
- (b) 採購員收到樣板並核對符合要求後連同備忘錄轉交地盤代表。
- (c) 地盤代表收到樣板後核對是否符合要求，然後連同工程合約規定的材料報批表 (Submission Form)呈交業主代表審批。
- (d) 如材料不獲批准而供應商又無法按要求送板時，則物資與運營部配合地盤代表組織約見業主代表，由供應商直接向業主代表解釋。若業主代表仍不接受時，採購員要匯報物資與運營部總經理研究應否更改供應商；如採購額在 1000 萬港元以上按本程序 6.1.5c.處理。
- (e) 材料經批准後，地盤代表要保留一份業主代表的批准文件及樣板。
- (f) 地盤編制物資申請表交採購員，按採購程序辦理採購。



7. 附表

PRO4-01(C)	供應商登記表
PRO4-02(C)	供應商評估表
PRO4-03	物資詢價表
PRO4-04T	報價邀請書
PRO4-04SL	邀請報價供應商名單
PRO4-05(F)	物資採購比價單
PRO4-07	訂購合約
PRO4-09(E)	物資申請表
PRO4-10(B)	地盤零星材料申請表
PRO4-11C	混凝土申請單
PRO4-11R	地盤鋼筋進場通知
PRO4-11EM(A)	地盤機電材料進場通知
PRO4-12(D)	施工材料及設備採購方案
PRO4-13(D)	地盤零星材料比價單
PRO4-15(C)	供應商評估匯總表
PRO4-16(A)	Quotation Inquiry Sheet
PRO4-17(B)	供應商處分會審表
PRO4-18(A)	警告信/停止投標資格
PRO4-19(A)	關於從認可供應商名冊中除名的通知
PRO4-20(D)	物資採購開標及議標記錄表
PRO4-21(A)	暫准使用供應商申請表
PRO4-22(D)	物資採購會審表
PRO4-23(E)	機械設備購置及處理會審表



標準工作程序

表號：PRO4-01(C)

中國建築工程(香港)有限公司

供應商登記表

內部選項：認可供應商准入申請[®] / 暫准供應商轉正[®] / 認可供應商資料更新[®]

供應商編碼：_____主營業務：_____

商戶名稱：英文：_____

中文：_____

商業登記號/企業營業執照號：_____註冊日期：_____

註冊地址：_____

聯絡地址：_____

電話：_____電子郵箱：_____

*網址：_____

公司性質：

1. ☐獨資經營 ☐合伙經營 ☐有限公司 ☐上市公司
☐其它 _____

*2. 所屬母公司名稱：_____

附屬子公司名稱：_____

聯營公司名稱：_____

已發行資本：☐港幣壹佰萬元或以下 ☐港幣壹佰萬至壹仟萬元
☐港幣壹仟萬至壹億元 ☐港幣壹仟萬元以上

年營業額：☐港幣壹佰萬元或以下 ☐港幣壹佰萬至壹仟萬元 ☐港幣壹仟萬至壹億元
☐港幣壹億元至拾億元 ☐港幣拾億元以上

業務性質及範圍：_____

主要客戶：本地 % 國內 % 海外 % 合計 100%

客戶名稱：_____

主要貨源：本地 % 國內 % 海外 % 合計 100%

*廠方名稱：_____

*總代理品牌：_____

*代理品牌：_____

*經銷品牌：_____

(有關上述經營牌子的產品，需填報附件I供應記錄)



標準工作程序

供應商登記表

組織架構:

1. 公司最高負責人/法人: _____ 職位: _____
法人身份信息: _____ 負責人/法人聯系方式: _____
業務聯絡人: _____ 職位: _____
業務聯絡人聯系方式: _____
2. 員工人數: 行政管理人員 _____人 營業員 _____人 一般事務員 _____人
3. 公司架構表: 請附上公司架構表

*自有廠房/倉庫及設施設備:

1. 廠房/倉庫總面積: _____ 地點: _____
產品及生產線數: _____ / _____ (條) 年產能: _____ (每條生產線)
2. 門市部: 附屬: _____ 間 名稱: _____
聯營: _____ 間 名稱: _____
3. 主要設備: _____

*ISO 體系認證資料:

1. ISO 9001證書: _____
2. ISO 45001或認可證書: _____
3. ISO 14001證書: _____

*ESG政策 / 綠色產品認證: _____

須提交公司註冊資料副本, 相關文件需蓋上公司印:

a.	☐ 商業登記証 (Business Registration Certificate) / 企业营业执照
b.	☐ 法團成立表格 (Incorporation Form NNC1) 或 周年申報表 (Annual Return NAR1) [香港公司適用]
c.	☐ 公司架構表及簡介
d.	☐ 類似業務歷史業績及獎項記錄
*e.	☐ 資質証明和許可證 (內地必須)
*f.	☐ 公司财务报表或相关财务証明 (內地必須)
g.	☐ 其他技术资料

註: *號為選填項目

填報公司簽名印章: _____

公司專用

- ☐ ① 認可供應商准入申請意見/建議: _____
- ☐ ② 暫准供應商轉正申請意見/建議: _____
- ☐ ③ 認可供應商主動提出資料更新 / 公司要求供應商進行資料更新

採購員建議: _____ 物資與運營部副總審核: _____ 物資與運營部總經理批准: _____

日期: _____



*附件 I

公司名稱：_____

代理產品（#獨家代理 / 一般代理 / 授權分銷）

序號	產品	品牌	產地	已有客戶	應用項目	年份	備注

填報說明：

1. 請提供產品供貨的工程項目參考資料；
2. #請刪除不適用項。



標準工作程序

表號：PRO4-02(C)


供應商評估表

地盤名稱：_____ 地盤編碼：_____ 日期：_____

編碼	供應商	物資名稱	地盤評級					備註
			總評級 100%	質量 50%	安全 (註 2.1) 20%	ESG (註 2.2) 10%	服務 20%	

物料控制人員：_____
地盤代表審核：_____
地盤經理審批：_____

- 註：
- 評估辦法及準則：
 - 供應商表現單項 / 總評級分為：A(優秀)、B(良好)、C(一般)、D(差劣)，如供應商進地盤供貨/服務期間違反現行法定的安全及環保要求而導致公司蒙受違例檢控等情況，應將其總評級定為 D(差劣)。
 - 由物料控制人員網上評級，並必須評定 1 名 / ≤ 10% A(優秀) 及 1 名 / ≤ 10% C(一般) 的供應商。
 - 如單項 / 總評級別為 D(差劣)，必須於備註欄說明原因，經地盤代表審核後由地盤經理線上審批。
 - 安全，環境、社會及企業管治 (簡稱 ESG) 具體評級準則如下：
 - 安全分以在地盤表現進行評級，準則如下：
 - 進入地盤的人士佩戴合規格的安全帽，並提供合適的個人保護用具包括眼罩、口罩、聽覺保護器具、手套及安全鞋等。予該等人士，及確保他們正確使用該等保護用具。
 - 起重機械或吊重器具在依照建築地盤(安全)及工廠及工業經營(起重機械及裝置)規例的規定取得了有效之檢驗證明文件。
 - 電動及手工具符合工廠及工業經營(電)及(木工機械)規例及建築地盤(安全)規例的要求。
 - 運送、儲存及使用危險物料時符合工廠及工業經營(危險物質)、(可致癌物質)規例的要求，並且在該容器上張貼正確標籤及即時呈交地盤該等物料的安全資料報告書。
 - 地盤人員持有有效之“平安咭”(綠咭)。
 - 如引致公司違例檢控，應將其總評級定為 D(差劣)。
 - ESG 分在地盤表現進行評級，評核因素包括但不限於如下：
 - 環境(E):
 - 貨品本身是否環保產品。
 - 有否回收、減少包裝物料 (包括卡板)。
 - 運輸設備及過程是否符合環保要求。
 - 供應商有否得到環保相關的認證 (如 ISO 14001、香港綠色機構、減廢證書、減碳證書等)。
 - 如引致公司違例檢控，應將其總評級定為 D(差劣)。
 - 社會(S):
 - 供應商僱用員工，不應帶有歧視性別、種族等。
 - 供應商有否參與社會服務回饋社會
 - 供應商有否得到社會相關的認證 (例如 SA8000、商界展關懷、開心工作間 etc.)
 - 供應商有否提供培訓給員工職業發展
 - 供應商有否已經制定可持續採購政策，並在可行的情況下選擇更環保的產品與服務
 - 企業管治(G):
 - 供應商及其員工是否注重廉潔行為及遵循法律法規要求履行合約
 - 供應商有否制定及實施 ESG/可持續發展相關的管治政策
 - 供應商有否定期為所有員工提供關於商業行為守則培訓(例如反貪、數據安全等)



物資詢價表

工程工期：

[illegible]



標準工作程序

表號：PRO4-04T

中國建築工程(香港)有限公司

Transmittal 傳送 _____ Date 日期： _____
To 至：投標商 _____
From 發文人： _____ Tel No 電話號碼： _____
Subject 標題：投標報價邀請書 _____ Total Pages 總共頁數： _____
Message 內容： _____ (including this page)

報價邀請書

本公司或其關聯公司承建/投標之 _____ 工程，特邀請 貴公司參與
_____ 報價，現隨函附上下列資料：

- ☐ 材料技術及品質要求
- ☐ 材料估計數量
- ☐ 預算批板及送樣板房日期
- ☐ 送貨日期
- ☐ 合約條款
- ☐ 安全及健康規則
- ☐ 環保要求

本工程截止報價日期為 _____ 年 _____ 月 _____ 日正午時，報價單有效期至 _____ 年 _____ 月 _____ 日；請詳閱有關文件，依以下方式遞交報價單，並註明物資與運營部 _____ 先生/小姐收。本公司有權選擇任何報價，逾時送交報價將不予考慮。多謝合作！

遞交報價單方式：

- ☐ 電郵 - 報價單請電郵至 _____@cohl.com
- ☐ 把密封之正本報價單投入物資與運營部投標報價箱內

簽發： _____
中國建築工程(香港)有限公司
物資與運營部總經理 / 授權人士

ML/ /



標準工作程序

僅限內部使用

表號：PRO4-04SL

邀請報價供應商名單

地盤：			()		日期：	
	擬邀請供應商	聯絡人	電話	電郵	供應商類型 (選項：認可、暫准、新、地盤建議)	
1.						
2.						
3.						
4.						
	註：主合約規定名單加 *號 / 指定供應商加 #號					
擬邀請名單少於3家理由：						

採購員

物資與運營部總經理/副總/授權人員



標準工作程序

表號：PRO4-05(F)
編號：

物資採購比價單

地盤名稱:
物資名稱:

		供應商名稱:				備注				備注				備注		備注	
		報價單編號:				(品牌/型號/描述)				(品牌/型號/描述)				(品牌/型號/描述)		(品牌/型號/描述)	
規格及型號		單位	數量	投標成本	首次單價	最終單價			首次單價	最終單價			首次單價	最終單價			
總計																	
		選取項目金額:															
		備註:															
供應商表現評價: A(優秀)、B(良好)、C(一般)、D(差劣)																	
產品評價 / 分析:		主合約 / 地盤要求															
1. 品牌/產地:																	
2. 主合約指定品牌/定明名單																	
3. 符合ER/Spec/地盤技術要求																	
4. 付款條件																	
5. 供貨期																	
6. 價格固定期																	
7. 報價有效期																	
8. 其他																	
☐ 首次定標		☐ 補貨: *業主已批Submission, 不適合轉供應商; 按*合約單價補貨 / *議定新單價												原已修訂成本預算:		本採購總額 (暫定 / 總包價) HK\$:	
		*無Submission審批限制, 經比價定標												本次採購成本預算:		②累計採購總額 HK\$:	
		註: *選適用項												①新修訂成本預算:		盈/虧 = ①-② HK\$:	
建議:																	
會審意見:																	
日期: 年 月 日																	
招標文件/合同文件 合規審查結論: ☐ 合規 ☐ 不合規																	
參加人簽名:	中建香港物資與運營部採購會審決策																
	部門總經理		分管副總		採購員		合規稽查員		地盤 註2								

註： 1. 此表格適用於HK\$1000萬以下的物資採購；及單機價格HK\$100萬以下的機械設備
2. 非最低標中標、獨家供應、其他特殊情況等需地盤加簽



標準工作程序

表號：PRO4-07

日期

訂購合約

第 頁共 頁

Date:

PURCHASE CONTRACT

Sheet of Sheets

致 TO	合約編號 Contract No: 工程編註 Project Ref: 物資申請表號:				
請按照本頁及背頁所列條件供應下述貨品與敝公司 Please supply and deliver the undermentioned goods in good order subject to the terms and conditions on the face and reverse side hereof.					
項目 Item	物料名稱 Description	數量 Quantity	單位 Unit	單價 Rate	金額 Amount

買方簽署並蓋章
Buyer Signature &
Co. Chop

賣方簽署並蓋章
Seller Signature &
Co. Chop



標準工作程序

表號: PRO4-09(E)

物資申請表

地盤名稱: _____ 申請編號: _____ 制單日期: _____
固定資產: _____ 是否代購: _____ 判頭名稱: _____ 需工程公司审批: _____ 收貨人及電話、電郵: _____

樣板報批詢價: 是/否	預算呈交樣板日期: _____
採購方案	永久工程物資或超\$50 萬臨時物資必填 預算金額: _____ 邀請報價供應商(如合約指明品牌必須填報): _____

備註: _____

序號	名稱/規格	品牌	產地	單位	計劃數量	計劃進貨日期	BQ/SOR 數量	已申請數量	備註
----	-------	----	----	----	------	--------	-----------	-------	----

物資與運營部簽收 : _____ 地盤 QS : _____ 地盤申請人 : _____

物資與運營部總經理 : _____ 地盤經理 : _____ 聯絡電話、電郵 : _____



標準工作程序

表號：PRO04-10(B)
編號：

地盘零星材料申请表

地盘名稱:

申請人：

联系方式：

申請日期：

申請表內容											
序號	材料名稱	規格	單位	數量	進貨日期	材料用途及使用位置	是否定點	合約編號/項目	送貨地點	收貨人	聯絡電話
1											
2											
3											
定點名冊材料申請表必須由材料員填寫"合約編號"及"項目"											
備注欄											
建議追討單位：		☐ 中建自用 ☐ RE ☐ 分判商 ☐ 其他			申請人上級主管簽署			地盤經理簽署			
申請人簽署：											
物料控制人員:											
工料測量師簽署：											
日期											

填報摘要：

1. 申請任何貨品時，必須填寫清楚所有貨品之名稱及規格、數量及存放位置。

2. 清楚填上合理之到貨日期、材料用途及使用位置。

3. 本次申請是否代分判訂購，如「是」，請填寫分判名稱, 並交由QS審核簽署及地盤內派／所屬主管核實。（地盤主管即各組別之領導人，如CM、地盤代表、PM及工程主管）；如「否」，請註明為中建自用;

4. 所有申請如填寫不清晰、不合理或資料遺漏，需重新填寫。



標準工作程序

地盤內部使用

表號：PRO4-11C

混凝土申請單

地盤名稱:

年 月 日

分項工程名稱	
混凝土使用部位	
按圖則計算用量 (m3)	
申請混凝土標號	
申請混凝土數量 (m3)	
申請混凝土使用時間	
上部份管工填寫，下部份物料控制人員填寫	
混凝土實際用量 (m3)	
混凝土損耗量 (m3)	
混凝土損耗率 (%)	
混凝土開槽時間	
混凝土收槽時間	
說 明	

總管審核:

QS:

管工申請:

- 註: 1. 本表格只供內部申請使用。
2. 柯打石矢需另行填寫石矢供應商指定的柯打表。



地盤鋼筋進場通知

供應商名稱: _____ 本通知編號: _____ 年 月 日

地盤名稱: _____ 交貨地址: _____

收貨人姓名及電話: _____ 訂購合約/供貨通知編號: _____

根據上述訂購合約/供貨通知，請貴司交付以下鋼筋到指定地點:

序號	鋼筋類別	規格	單位	數量	進貨日期	備 註

簽發: _____
地盤經理



地盤機電材料進場通知

供應商名稱: _____

本通知編號: _____ 年 月 日

地盤名稱: _____

交貨地址: _____

收貨人姓名及電話: _____ 訂購合約(P.C.)編號: _____

根據上述訂購合約，請貴司交付以下機電材料到指定地點:

P.C. 序號	機電材料描述	單位	數量	進貨日期	備 註

簽發: _____

地盤經理



修訂版本： (初次提交為 "0")
日期：

最新修訂完工期:

註：永久工程物資或超\$50萬臨時物資必填。

物資與運營部簽收：



標準工作程序

表號：PRO04-13(D)
編號：

地盘零星材料比價表

地盘名稱:幣種:

物資名稱：						供應商名稱											
						報價日期											
序號	是否為定點產品	產品代碼	定點產品報價理由	申請單編號	規格要求	單位	數量	單價	總價	備注 (按期交貨/其他)	單價	總價	備注 (按期交貨/其他)	單價	總價	備注 (按期交貨/其他)	
1																	
2																	
3																	
						總計											
供應商表現評價：A(優秀)、B(良好)、C(一般)、D(差劣)、首次合作																	
產品評價/分析(如適用)																	
建議																	
審批意見		地盘經理審批				地盘QS審批				採購人				申請人			

注：此表格適用於HK\$ 5萬以下的物資採購



標準工作程序

表號: PRO4-15(C)

供應商評估匯總表

報表日期:

供應商名稱:

供應商編碼:

供貨額:

採購員:

合約額:

地盤編碼	地盤名稱	物資名稱	總評級 100%	質量 50%	安全 20%	ESG 10%	服務 20%	備註
地盤評級								
物資與運營部評級				(只需填總評級)				
綜合總評級								
去年綜合總評級								

評估結果:

繼續使用 ☐

觀察使用 ☐

警告 / 暫停投標 / 除名 ☐

採購員:

物資與運營部副總經理:

物資與運營部總經理:

寫字樓評估準則及辦法:

- 部門評級 / 綜合總評級別: A(優秀)、B(良好)、C(一般)、D(差劣)。
- 採購員必須評定 1 名 / $\leq 10\%$ A(優秀) 及 1 名 / $\leq 10\%$ C(一般) 的供應商。
- 綜合總評級為 C(一般)的供應商應列為觀察使用, 連續兩年綜合總評級為 C(一般), 物資與運營部應與供應商進行約談檢討。
- ≥ 2 個地盤評級為 D(差劣) / 綜合總評級為 D(差劣), 物資與運營部應與供應商進行約談檢討, 並向供貨商發警告信或經物資與運營部總經理決定暫停投標 / 除名。
- 地盤: 地盤評分佔 60%、物資與運營部佔 40%。



標準工作程序

表號: PRO4-16(A)

Quotation Inquiry Sheet

Project :

Tender Ref.:

To	:	Tenderer	Date	:	
Tender	:	('hereafter 'Equipment and Materials')			

We would like to invite you to quote in HK dollars for the following:

1.	Works / Supply	
2.	Scope of Offer	
3.	Tender Documents	
4.	Warranty	
5.	Contract period	
6.	Tender / Quotation Return Date and Venue	
7.	Return Documents	
8.	Validity of Quotation	
9.	Remarks	
10.	Date of collection	
11.	Place of collection	

Please review your cost & offer us your best offer for this tender and submit your quotation by the stipulated date and time above.
Should you have any query, please feel free to contact our Mr. xxx at xxx or or email at xxx.

Issued by CSHK:

Received by : _____

Company Chop : _____

Authorized Representative
ML/EK/

Date : _____



標準工作程序

表號: PRO4-17(B)

【供應商處分會審表】

供應商: _____

供應地盤: _____

供應產品/服務: _____

事故類別	安全因素	ESG 因素	質量因素	準期因素	違約因素	商業操守因素
嚴重						
一般						
詳細情況						

安全環保/質量技術/商務部:

已開展調查

是 ☐

否 ☐

已有調查報告並建議

是 ☐

否 ☐

物資與運營部經辦人意見:

日期: _____

物資與運營部分管副總建議:

一. 發出警告信 ☐

二. 暫停投標資格

三個月 ☐

六個月 ☐

一年 ☐

三. 從認可名冊中除名並納入禁止交易企業名冊 ☐

四. 及/或其它:

參 加 人 簽 名 :	中 建 香 港 物 資 與 運 營 部 採 購 會 審 決 策			
	部門總經理	分管副總	採購員	合規稽查員



標準工作程序

表號：PR04-18(A)

供應商名稱
供應商地址
負責人名稱

*警告信/停止投標資格

有關：_____地盤之_____供貨合約(合約編號：_____)

貴公司在上述地盤供貨合約有下列 *未履行合約情況 / 欠佳表現：

上述 *未履行合約情況可構成違反合約條款與條件第____條的規定 / 欠佳表現 嚴重影響地盤工程進度，貴公司必須在____個工作天內（即在 年 月 日前）糾正上述所有事項，並須採取行動及步驟以維持合約條款與條件所要求的服務水平。

現對貴公司發出 *書面警告/ 並停止貴公司的投標資格為期____個月。望 貴司能在短期內作出改善，如在上述日期仍未作出任何滿意的補救措施，我司將有可能從認可供應商名冊中剔除貴司的投標資格，並將會根據合約條款與條件第6.(2)條的規定，對貴司採取相應行動。同時，我們保留一切追究權力。

此致

日期: 年 月 日

蓋章:

附件: (____頁)

*請刪去不適用



關於從認可供應商名冊中除名的通知

致: _____

貴公司長期以來在地盤的供貨質量、準期、安全、環保、服務、守約、商業操守、財政*等管理表現均不能滿足公司的要求，雖經公司多次出信書面警告，但仍沒有作出改善。

現公司決定採取進一步的行動，停止貴公司的投標資格，並從認可供應商名冊中除名，不得參與任何投標及進行工程，即時生效。

此致

日期: 年 月 日

蓋章:

* 請刪去不適用。



標準工作程序

表號：PRO4-21(A)

暫准使用供應商申請表

選項：暫准供應商准入申請^① / 資料更新^②	
供應商編號：	主營業務：
地盤編碼：	地盤：
需採購物資：	
供應商名稱(中)：	
供應商名稱(英，如有)：	
實際收款單位：	
供應商企業規模(內地必填)：	供應商納稅人類型(內地必填)：
公司電話：	電郵：
業務聯絡人姓名：	聯系方式：
公司地址(中)：	
公司地址(英，如有)：	
是否禁止交易企業：	

基於以下原因又要滿足地盤的供貨要求，請批准在欠缺供應商登記情況下向該供應商訂購上述物資。

- 原因：
- ☐ 與供應商初次合作，宜觀察表現。
 - ☐ 供應商為業主則師指定商號
 - ☐ 供應商堅持不填回我司之“供應商登記表”

須提交供應商資料，相關文件需蓋上公司印：

1. ☐ 商業登記証 (Business Registration Certificate) / 企业营业执照
2. ☐ 銀行戶口證明
- *3. ☐ 公司簡介及架構表
- *4. ☐ 歷史業績及獎項記錄

註：*號為選項

申請人意見/建議：

申請人姓名：

申請日期：

採購員

物資與運營部副總審核

物資與運營部總經理審批

年 月 日

年 月 日

年 月 日



物資採購會審表

參加人簽名：	中 建 香 港 物 資 採 購 決 策 委 員 會						工程公司 / 部門	地盤
	主任	副主任	成員			監督員		

註： 1. 此表格適用於HK\$1000萬以上的物資採購



機械設備購置及處理決策委員會

註: 1. 此表格適用於單機價格HK\$100萬以上的機械設備購置及處理
