

中國建築工程(香港)有限公司

標準工作程序

第四號：物資採購工作程序

編號：PRO/004

版本：第二版：H

日期：2022 年 6 月



標準工作程序

第二版：H

日期：2022.06

物資採購工作程序

工作程序修改記錄表

修改日期：2022.06

程序	修改內容簡要	新版
4	1. 修訂4.2內容、新增4.3內容 2. 修訂5.作業程序內容 3. 更新表格 PRO4-05(D)、PRO4-09(D)、PRO4-15(B)、 PRO4-17(A)、PRO4-20(C)、PRO4-22(C)、PRO4-23(D)	第二版 H

批准：


常務副總經理



目 錄

1. 目 的
2. 範 圍
3. 參考資料
4. 定 義
5. 作業程序
 - 5.1 認可供應商
 - 5.1.1 供應商名冊制定
 - 5.1.2 供應商評估
 - 5.1.3 供應商名冊更新
 - 5.2 採購
 - 5.2.1 採購方案及採購成本
 - 5.2.2 採購原則
 - 5.2.3 發標及回標
 - 5.2.4 議價、議價會及回標
 - 5.2.5 定標決定供應商
 - 5.2.6 物資申請
 - 5.2.7 簽定《訂購合約》
 - 5.2.8 材料審批及供應商未能履約
 - 5.2.9 代分判商採購
 - 5.2.10 鋼筋採購辦法
 - 5.2.11 大宗材料採購辦法
 - 5.2.12 瓦仔、潔具、門五金、化工、機電設備材料及特殊材料採購辦法
 - 5.2.13 開辦器材、機械設備等固定資產採購辦法
 - 5.2.14 定點及零星物資採購辦法
 - 5.2.15 電腦及有關軟、硬件訂購辦法
 - 5.3 進貨
 - 5.4 驗收
 - 5.5 儲存、保養及發放
 - 5.6 對供應商的處分
 - 5.7 物料採購風險管理



6. 附錄

附錄I 物資採購流程圖匯總

附錄II 投標之材料詢價辦法

附錄III材料報批辦法

7. 附表

PRO4-01(B)	供應商登記表
PRO4-02(B)	供應商評估表(網上評估)
PRO4-03	物資詢價表
PRO4-04	報價邀請書
PRO4-05(D)	物資採購比價單
PRO4-07	訂購合約
PRO4-09(D)	物資申請表
PRO4-10(A)	地盤零星材料申請表
PRO4-11R	地盤鋼筋進場通知
PRO4-11C	混凝土申請單
PRO4-11EM	地盤機電材料進場通知
PRO4-12(C)	施工材料及設備採購方案
PRO4-13(C)	地盤零星材料比價單
PRO4-14(A)	標前採購協議申請單
PRO4-15(B)	供應商評估匯總表(網上評估)
PRO4-16	Quotation Inquiry Sheet
PRO4-17(A)	供應商處分會審表
PRO4-18(A)	警告信/停止投標資格
PRO4-19(A)	關於從認可供應商名冊中除名的通知
PRO4-20(C)	物資採購開標及議標記錄表
PRO4-21	暫准使用供應商申請表
PRO4-22(C)	物資採購會審表
PRO4-23(D)	機械設備購置及處理會審表

1. 目的

根據工程質量、安全及健康和環保要求，選擇合適的供應商，以保證所有與工程質量、安全及健康和環保有關的物資採購能滿足業主及有關人士的要求。

2. 範圍

適用於公司及工程公司所承包工程之各類與工程質量、安全及健康和環保有關的物資採購。公司及工程公司之物資採購均通過物資部按本程序進行。

3. 參考資料

公司《質量管理手冊》、《安全及健康手冊》及《環保管理手冊》

4. 定義

參照《質量管理手冊》、《安全及健康手冊》及《環保管理手冊》有關名詞解釋。

4.1 零星材料：指可從定點供應商名冊中購買的材料。

4.2 固定資產：指使用年限超過一年，且單價為 3 仟港元以上的辦公用品及單價為 1 萬港元以上的施工機械設備(器材)等資產。

4.3 採購管理中心：經公司批准成立的採購管理中心，物資部因應個別情況授權該中心進行採購與管理相應的材料設備，採購程序按本程序規定進行，沒有授權管理範圍由物資部負責。採購管理中心架構由該中心及物資部共同審批。

5. 作業程序

5.1 認可供應商

5.1.1 供應商名冊制定

- a. 與工程質量、安全及健康和環保有關物資之供應商在進入供應商名冊前應填寫表格 PRO4-01《供應商登記表》，並交採購員。
- b. 物資部總經理應以供應商的實力、商譽及以往服務的表現作為依據，決定是否列入名冊內。
- c. 物資部秘書負責編印並保存經物資部總經理簽名的最新版供應商名冊以供採購員查閱。

5.1.2 供應商評估

- a. 對每年與公司及工程公司有來往的供應商，地盤負責按表格 PRO4-02《供應商評估表(網上評估)》之評估準則填報，各地盤供應商之評分將匯總至表格 PRO4-15《供應商評估匯總表(網上評估)》。物資部及機電公司(機電材料適用)於《供應商評估匯總表(網上評估)》按供應商整體表現作評估並提出意見。
- b. 一般工程供應商評分由 2 部份組成，地盤平均評分佔 60%，物資部評分佔 40%；機電工程供應商評分由 3 部份組成，地盤平均評分佔 60%，物資部評分佔 20%；機電部評分佔 20%。供應商按評分分為 A(優秀)、B(良好)、C(一般)及 D(差劣)四級。

5.1.3 供應商名冊更新

- a. 物資部每年定期負責對所有供應商按過去一年的表現進行全面評估，覆審並更新供應商名冊。

- b. 暫準使用供應商為初始合作的供應商，需觀察其表現待表現獲充分肯定後，需按列入認可供應商名冊程序辦理；或不經常合作之認可供應商其超過五年未有成交紀錄。
- c. 被除名供應商為已結業、評審不合格之供應商或超過八年未有成交記錄之認可供應商、超過三年未有成交記錄之暫準使用供應商。
- d. 被除名的供應商不能使用，若需恢復使用，由物資部總經理批准後方可選用。
- e. 更新後的供應商名冊經物資部秘書重新編印後，由物資部總經理簽名確認。

5.2 採購

5.2.1 採購方案及採購成本

- a. 地盤應盡早組織按表格 PMP-5《施工材料及樣板報批計劃表》編制材料報批計劃表及填報表格 PRO4-12《施工材料及設備採購方案》，建議供應商(如合約指明品牌必須填報)，供應商名單最終由物資部總經理/授權人員決定。如根據工程的進展及實際情況與原採購方案內容產生變化，地盤可從《物資申請表》的採購方案部分反映最新信息後提交物資部/授權人員簽收並跟進。
- b. 在工程中標一個月內，工程部投標科應提供投標成本預算資料予物資部/授權人員。

5.2.2 採購原則

- a. 當工程合約對安全及健康和環保有特別要求需要進行相關物資採購時，物資部可會同地盤及有關方面向供應商作出說明，並在合約中列出相關的特別條款及條件。對於合約無特別要求的物資，採購員要兼顧貨物品質及交貨中的安全及健康和環保因素(如噪音、能源消耗、揚塵、廢氣、廢料、化學品等)，在對此作出評價的基礎上選擇合適供應商，採購較為安全及健康和環保的產品。
- b. 若工程合約規定公司需協助業主在貨源地、收貨地或工作現場進行檢驗時，地盤經理應盡早提出，以便物資部在邀請供應商報價時能作出相應的規定來滿足業主檢驗的要求。

5.2.3 發標及回標

- a. 發標準備：地盤應提前將材料報批詢價申請連同相關合約要求 / 《物資申請表》提交予物資部。
- b. 物資部收齊地盤資料後，採購員須在認可供應商名冊內選取最少 3 家供應商會同地盤建議名單(如有)，並按表格 PRO4-04《報價邀請書》或 PRO4-16《Quotation Inquiry Sheet》編制報價邀請，由物資部總經理或授權人員決定名單並簽發。除採購額在 5 萬港元以下，採購員可用電話邀請報價外，其他金額的報價邀請一律須以書面方式發標。。
- c. 若採購員要選用尚未進入認可供應商名冊的供應商，應按表格 PRO4-21《暫准使用供應商申請表》填報，並經物資部總經理/授權人員批准後方可定標決策。
- d. 機電項目設備材料，10 萬港元以下由機電地盤按本程序第 5.2.3-5.2.7 處理，定標結果送交機電採購管理中心備案，10 萬港元以上由機電採購管理中心

按程序處理。

- e. 報價單處理。
- f. 採購額 1000 萬港元以下的報價單,可接受電郵或傳真傳達。
- g. 採購額 1000 萬港元以上的報價單, 正本報價單須密封後投入‘投標箱’, 由採購員連同物資部總經理或副/助理總經理/授權人員共同開標。
- h. 供應商如未在規定時間內回標則視為棄標, 無需供應商提供棄標函, 但需做好記錄。

5.2.4 議價、議價會及回標

- a. 採購額 1000 萬港元以下 (機械設備單機價格 100 萬港元以下), 由物資部總經理決定是否需要召開議價會, 如不需要召開議價會, 由採購員進行議價(機電設備材料由機電公司決定)。
- b. 採購額 1000 萬港元以上 (機械設備單機價格 100 萬港元/機電設備材料 500 萬港元以上), 必須召開議價會, 並需按表格 PRO4-20《物資採購開標及議標記錄表》做好會議紀錄。
- c. 議價後, 如需要回標, 回標方式按本程序第 5.2.3 (g)處理。

5.2.5 定標決定供應商

- a. 定標決定供應商的準則是在同等條件下, 優先選用最低價者; 若價格亦相同, 則再優先選用商譽、服務表現和供貨經驗更佳者(商譽、服務表現參考年度供應商評估結果, 供貨經驗參考其工程記錄)。對於非最低價中標或主合約指定唯一供應商供貨的, 需在定標文件中說明原因。
- b. 採購額在 1000 萬港元以下(機械設備單機價格 100 萬港元以下), 由採購員建議必要時徵詢有關工程公司/部門及地盤意見, 經物資部授權人員審核後交物資部總經理或副/助理總經理按表格 PR04-05《物資採購比價單》審批, 機電設備採購額 500 萬港元以下由機電公司按程序處理及決定。
- c. 採購額在 1000 萬港元以上(機械設備單機價格 100 萬/機電設備採購額 500 萬港元以上), 由物資採購決策委員會或機械設備購置及處理決策委員會按表格 PR04-22《物資採購會審表》或 PR04-23《機械設備購置及處理會審表》綜合比較各種因素後決定供應商。
- d. 機電設備材料定標後, 機電採購管理中心編制《中標通知函》(Letter of Award), 並由機電公司簽發。

5.2.6 物資申請

- a. 地盤有關人員應根據工程需求、物資採購定標會決定及業主代表審批情況按表格 PRO4-09《物資申請表》編制電子《物資申請表》, 經地盤經理審批後, 物資部採購員進行簽收。地盤應參照施工材料採購計劃, 預留足夠的採購時間, 提前作出物資申請。
- b. 《物資申請表》必須填寫清楚, 並盡可能包括下列各項內容: 物資名稱、規格、型號、數量、要求進貨日期、預算金額、邀請報價供應商(如合約指明品牌必須填報)、技術要求、適用於該項物資的質量、安全及健康和環保體系標準的名稱、編號和版本, 以及業主代表審批文件的拷貝, 必要時加上



附帶條件。

- c. 對於無需進行樣板報批的材料，地盤可直接編制電子《物資申請表》提交予物資部/機電採購管理中心跟進。

5.2.7 簽定《訂購合約》

- a. 採購員根據《物資申請表》的要求按表格 PRO4-07《訂購合約》編制《訂購合約》。《訂購合約》要包括《物資申請表》所列的項目、檢驗規格、基本條款及條件，必要時加上特別條款及條件。
- b. 採購員要把《訂購合約》交物資部授權人員審核後，由物資部總經理或授權人員簽發。
- c. 簽約前，供應商須認可所有與其有關的合約要求以及工作程序中與之有關的條款，並保證遵照執行。
- d. 《訂購合約》簽定後，如有任何修改，地盤需以書面通知有關採購員，由物資部與供應商協商修訂內容，並得物資部總經理批准後辦理合約變更手續。補充訂貨單按本程序第 5.2.2-5.2.6 辦理，原則上採用原合約供應商。
- e. 物資部要把供應商簽回的合約，連同《物資申請表》及《比價單》按《文件及資料管理工作程序》要求，按地盤分類存檔。地盤如需要有關副本時，可於公司內聯網內取閱。

5.2.8 材料審批及供應商未能履約

- a. 對於需向業主報批的材料，地盤應盡早提交材料報批詢價申請，物資部按本程序第 5.2.3-5.2.5 要求定標後，地盤正式向業主報批。
- b. 如材料不獲業主審批或供應商未能履約，要重新議價及定標。
- c. 對未能履約供應商的處分，按本程序第 5.6 處理。


5.2.9 代分判商採購

- a. 分判商需向地盤提交代購材料申請書。
- b. 由分判商包工包料，分判合約訂明由公司供應/代購材料，地盤提交的《物資申請表》須同時提供相關分判合約條款。
- c. 凡分判合約未有訂明由公司供應/代購材料，地盤提交的《物資申請表》須要經有關工程公司/部門合約科負責人審批；
- d. 地盤必須提供代分判商採購項目之 BQ 總數量，且須負責控制分判商申請之數量與實際用量(連約定損耗)相符以及必須按期扣回代購款項；
- e. 採購員收集和核對相關資料後按本程序第 5.2.3 至 5.2.5 處理。

5.2.10 鋼筋採購辦法

以統一採購方式, 物資部綜合地盤需求數量統一與供應商簽訂通用合約, 之後按地盤的進貨計劃進行分派, 由地盤向供應商發出訂貨單 送貨。

採購流程:

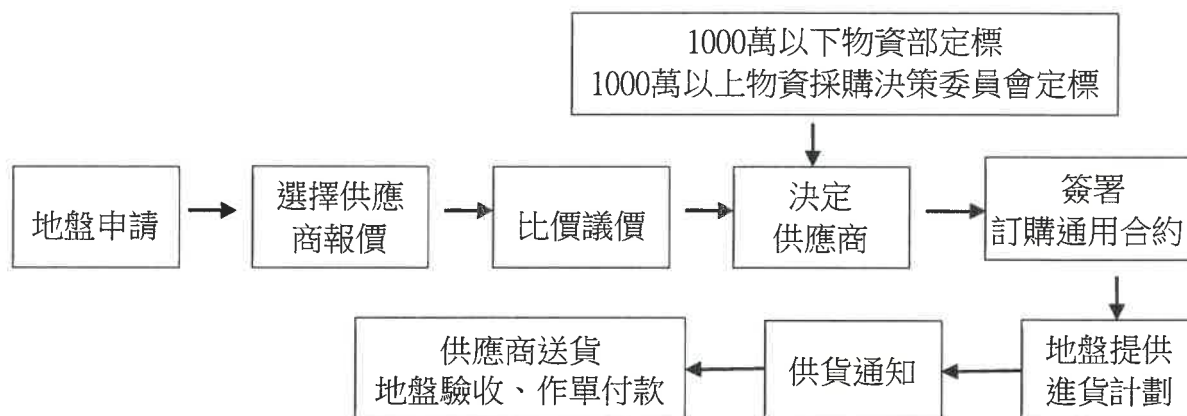


5.2.11 大宗材料採購辦法

a. 材料種類:

工字樁、鋼筋網、型鋼、閘板、石矢、沙漿、石料、石矢製品等

b. 採購流程:

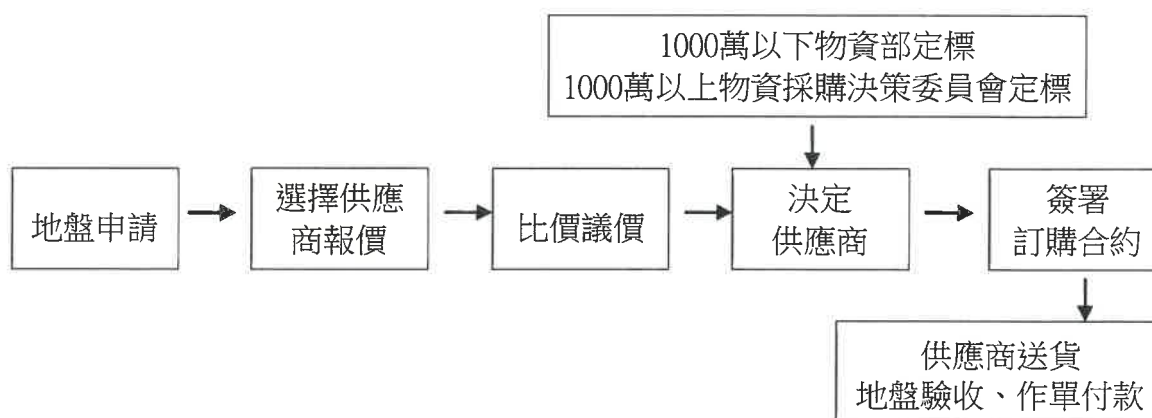


5.2.12 瓦仔、潔具、門五金、化工、機電設備材料及特殊材料採購辦法

a. 材料種類:

瓦仔、紙皮石、花崗石、大理石; 浴缸、面盆、座廁、龍頭、花灑、星盆;
門鎖、氣鼓、拉手、門鉸; 瓦仔膠、密縫膠、白膠漿、土工布、止水帶、啤
呤膠、伸縮縫、水務喉管、機電設備材料及其它特殊材料。

b. 採購流程：

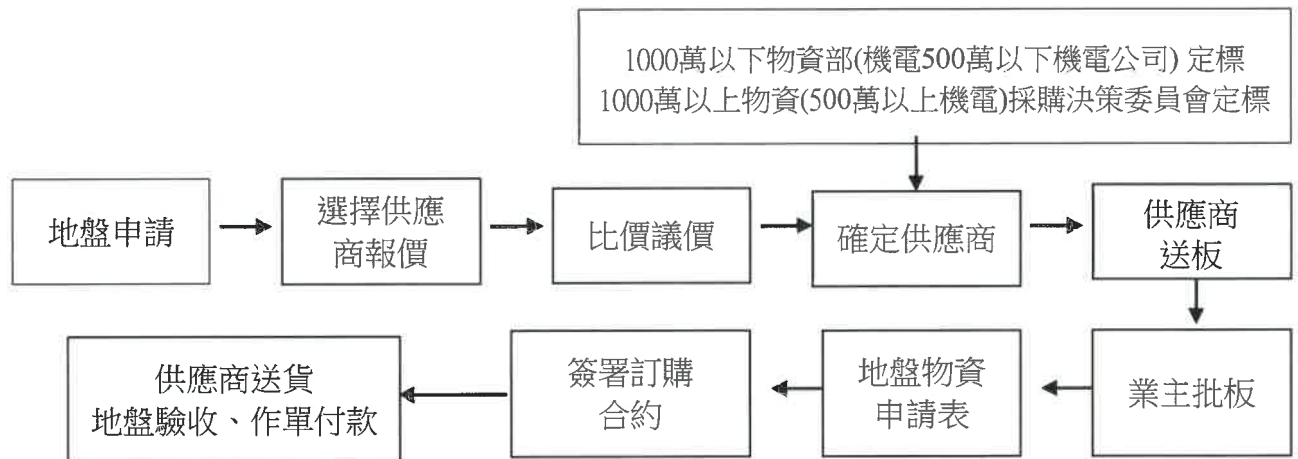


5.2.13 開辦器材、機械設備等固定資產採購辦法

a. 產品種類：

汽車、影印機、照像機、攝像機、傳真機、對講機、過膠機、電話、貨櫃、看更亭、流動廁所、環保缸、洗車機、危險品倉、地盤保安系統(掌形機、閉路電視、電動車閘)、測量及試驗儀器、施工機械設備等

b. 採購流程：

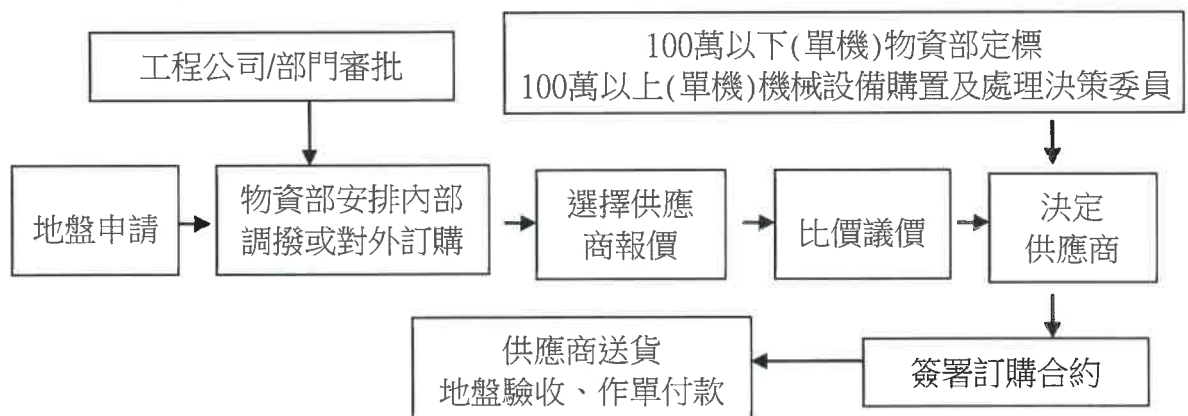


5.2.14 定點及零星物資採購辦法

a. 物資種類：

小五金及什項、電器材料、安全用品、消防器材、施工機具、吊重工具、電動工具、河沙、英泥、五星泥及膨脹膠、白膠漿、石矢慢干劑、止水帶、影印紙及傳真紙、蔗渣板及密縫膠、板模油、油渣、潤滑油、馬路網及批盪網等。

b. 採購流程:

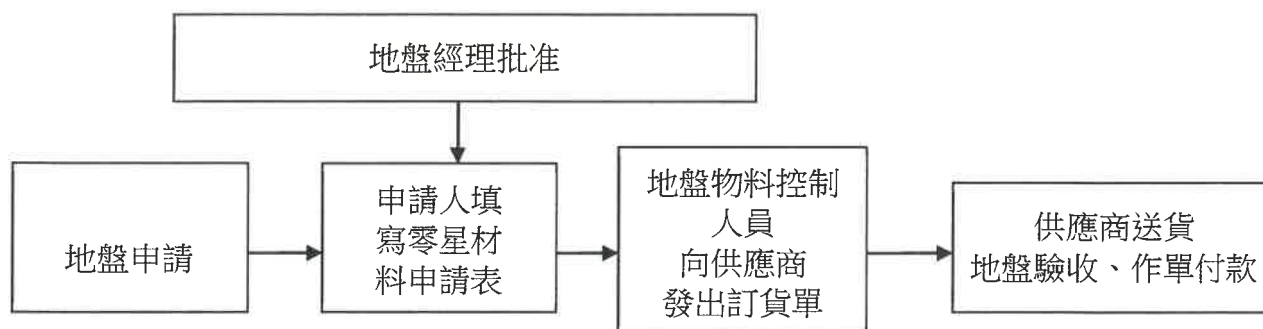

(a) 申請方式

申請人填寫表格 PRO4-10《零星材料申請表》報地盤經理審批，然後交物料控制人員辦理並存檔。

(b) 供應商的選用和訂購

零星材料中如屬定點材料可從定點供應商名冊中挑選供應商，但金額超過 20 萬港元時須交物資部採購。非定點材料，則由物料控制人員選擇幾家信譽好、品質優、送貨及時的供應商議價，然後按表格 PRO4-13《地盤零星材料比價單》做比價單，並提出選用供應商建議，經地盤經理審定才可通知供應商送貨；但貨價超過 5 萬港元時仍需通過物資部採購。

5.2.15 電腦及有關軟、硬件訂購辦法

參照信息化管理部的相關規定執行。

5.3 進貨

5.3.1 地盤物料控制人員要掌握採購合約中各項材料的供貨時間，督促供應商按時送貨，並及早通知地盤經理或總管，以便做好存倉準備。

5.3.2 訂購合約寫明按訂貨單分批送貨的材料：

- a. 鋼筋由物料控制人員按《訂購合約》或《供貨通知》的要求填寫表格 PRO4-11R《地盤鋼筋進場通知》提前向供應商發出訂貨單。《地盤鋼筋進場通知》上的負責人簽字要與簽字樣本相符。
- b. 石矢由物料控制人員提前 3-7 天向供應商發出訂貨單，之前管工要填寫表格 PRO4-11C《混凝土申請單》交物料控制人員存檔。
- c. 通用標準機電材料以暫定數量(Provisional Quantity)形式製定《訂購合約》，相關材料由地盤指定人員按《訂購合約》的要求填寫表格 PRO4-11EM《地盤機電材料進場通知》提前向供應商發出訂貨單。《地盤機電材料進場通知》上的負責人簽字要與簽字樣本相符。

5.3.3 如供應商未能按時供貨，物料控制人員要立即通知地盤經理及物資部經辦採購員，以便向供應商交涉解決。



5.4 驗收

採購物料的接收、檢驗、試驗和不合格品的處理要按《施工管理、檢驗和試驗工作程序》執行，以保證滿足工程合約要求。

5.5 儲存、保養及發放

採購物料的儲存、保養及發放要按《施工管理、檢驗和試驗工作程序》執行，以保證滿足工程合約要求。

5.6 對供應商的處分

5.6.1 對於表現欠佳的供應商: 出現連續未能按時、按質供貨，未能履約、違反商業道德、進地盤供貨/服務期間違反現行法定的安全及環保要求而導致公司蒙受違例檢控等情況，由物資部參考地盤、工程公司/部門、或相關部門的意見後，填寫表格 PRO4-17《供應商處分會審表》，建議處分級別，由物資部總經理審定，處分結果由物資部書面通知供應商。


5.6.2 處分級別: 按表格 PRO4-18《警告信/停止投標資格》書面警告、暫停供應商投標資格、按表格 PRO4-19《關於從認可供應商名冊中除名的通知》除名、及或其它。

5.6.3 供應商被暫停投標，期滿後由採購員提供供應商改善情況報告，物資部建議，然後交公司物資分管領導決定是否恢復投標資格。供應商改善情況報告重點闡述導致被暫停投標問題的改善情況和保證措施以及相應的監管方法。

5.7 物料採購風險管理

物資部定期對主要材料之價格、項目上之需求及市場之供求等風險進行分析評估、編制相關報告、跟進及監控措施。


6. 附錄 I: 物資採購流程圖匯總:

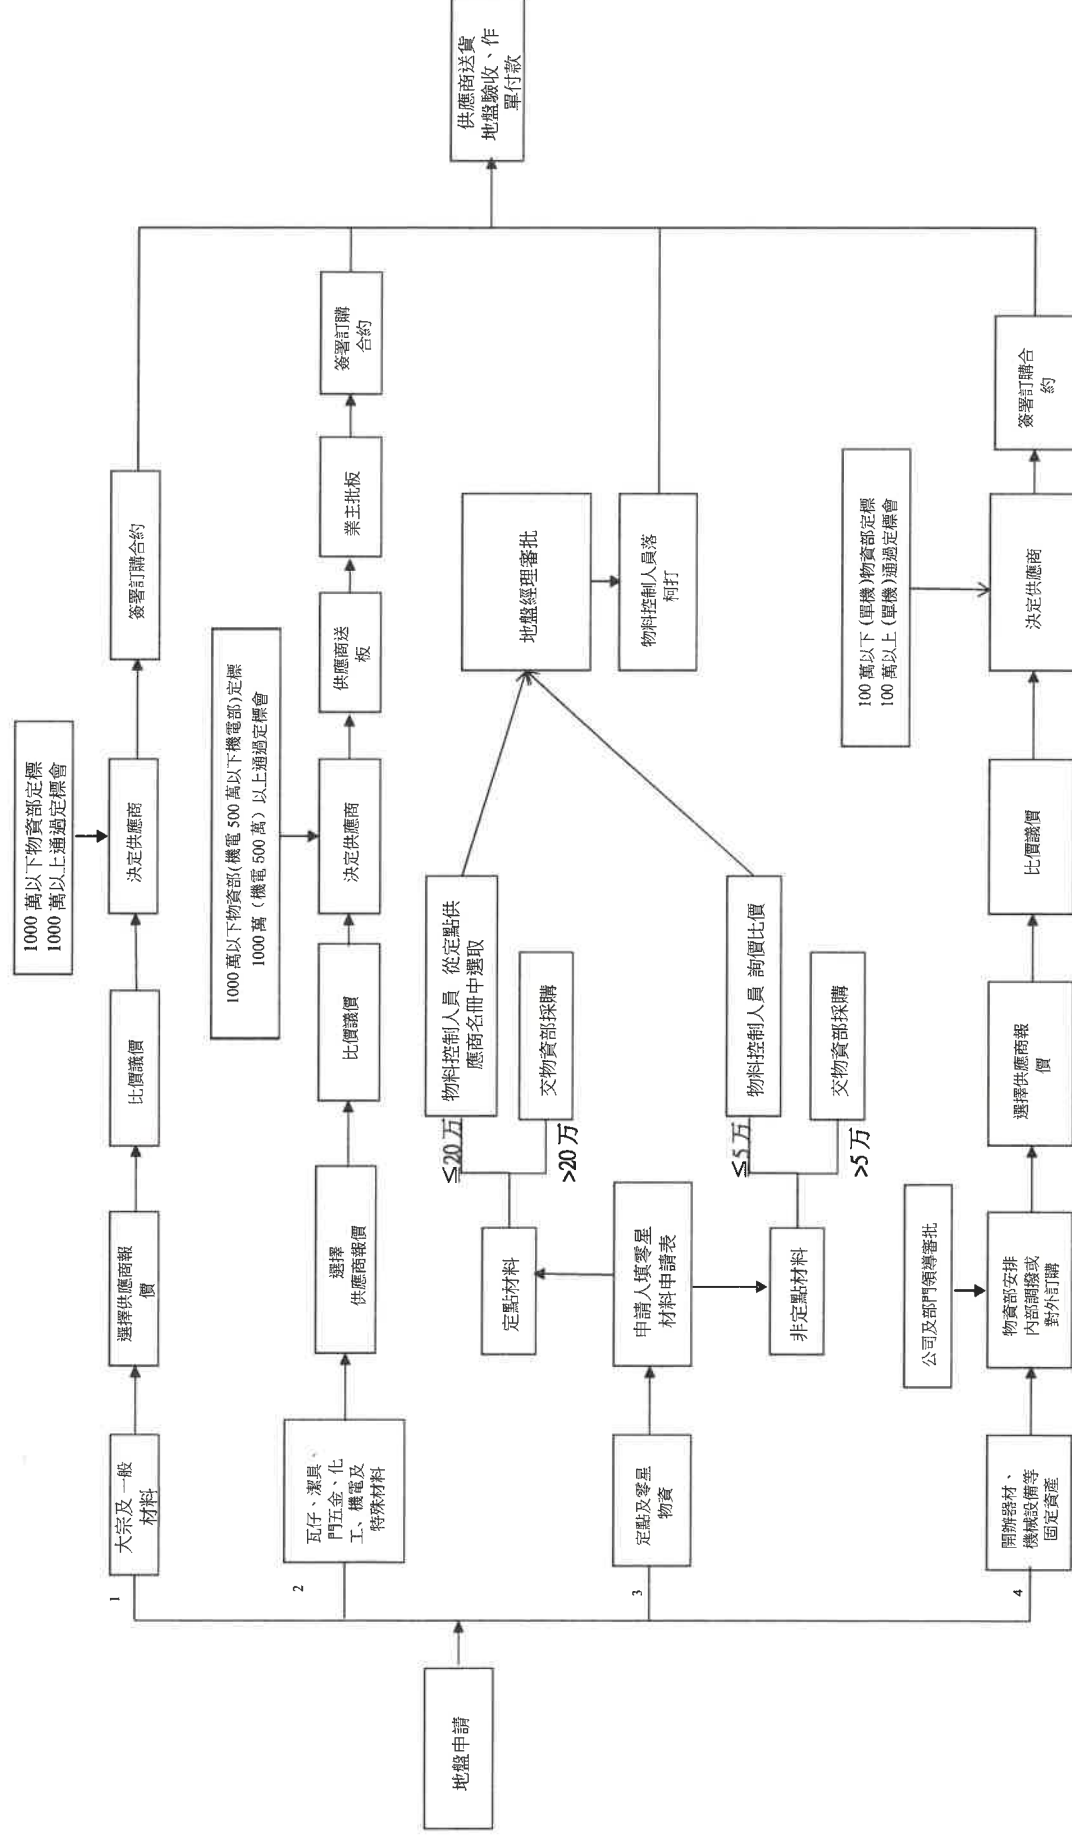

附錄 II. 投標之材料詢價辦法

- (a) 當投標工程所需 1000 萬港元以上材料時，工程公司/部門投標科應將表格 PRO4-03 《物資詢價表》及有關資料，分類交物資部主辦採購員詢價。
- (b) 採購員向若干個供應商詢價。
- (c) 供應商收到資料後如有疑問，採購員與投標估價科負責人應解答材料商問題或安排會議直接解答材料商的問題。
- (d) 報價單收齊後，由採購員轉交投標估價科。
- (e) 對於鋼筋、混凝土、型材、沙石料等對投標總價影響較大的大宗材料，若有關工程公司/部門認為需要簽標前採購協議時，需按表格 PRO4-14 填寫《標前採購協議申請單》，並要參考 5.2.2 辦法進行。物資部秘書負責將標前採購協議按投標工程項目存檔，並拷貝後送投標估價科。當投標工程中標後，採購員可根據有關協議直接通知供應商供貨。

簽署標前採購協議流程圖

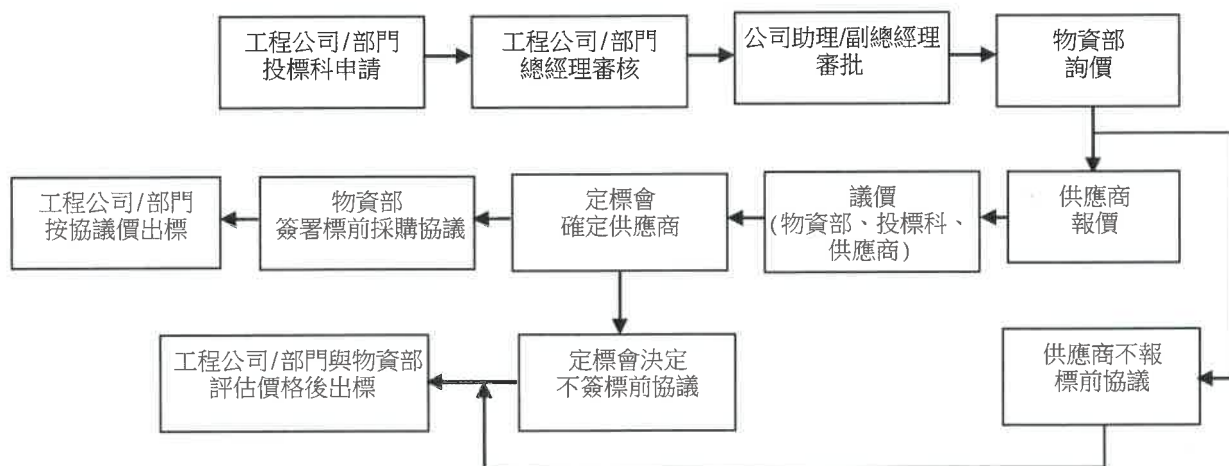

附錄III. 材料報批辦法

- (a) 採購員通知供應商送樣板及有關資料，包括物料及安全資料(Material Safety Data Sheet 簡稱 MSDS)到物資部或地盤寫字樓。如對需提供 MSDS 的材料範圍有任何疑問，可諮詢安環部。
- (b) 採購員收到樣板並核對符合要求後連同備忘錄轉交地盤代表。
- (c) 地盤代表收到樣板後核對是否符合要求，然後連同工程合約規定的材料報批表 (Submission Form)呈交業主代表審批。
- (d) 如材料不獲批准而供應商又無法按要求送板時，則物資部配合地盤代表組織約見業主代表，由供應商直接向業主代表解釋。若業主代表仍不接受時，採購員要匯報物資部總經理/機電採購管理中心研究應否更改供應商；如採購額在 1000 萬(機電 500 萬)港元以上按本程序 5.2.5C 處理。
- (e) 材料經批准後，地盤代表要保留一份業主代表的批准文件及樣板。
- (f) 地盤編制物資申請表交採購員，按採購程序辦理採購。



7. 附表

PRO4-01(B)	供應商登記表
PRO4-02(B)	供應商評估表(網上評估)
PRO4-03	物資詢價表
PRO4-04	報價邀請書
PRO4-05(D)	物資採購比價單
PRO4-07	訂購合約
PRO4-09(D)	物資申請表
PRO4-10(A)	地盤零星材料申請表
PRO4-11R	地盤鋼筋進場通知
PRO4-11C	混凝土申請單
PRO4-11EM	地盤機電材料進場通知
PRO4-12(C)	施工材料及設備採購方案
PRO4-13(C)	地盤零星材料比價單
PRO4-14(A)	標前採購協議申請單
PRO4-15(B)	供應商評估匯總表(網上評估)
PRO4-16	Quotation Inquiry Sheet
PRO4-17(A)	供應商處分會審表
PRO4-18(A)	警告信/停止投標資格
PRO4-19(A)	關於從認可供應商名冊中除名的通知
PRO4-20(C)	物資採購開標及議標記錄表
PRO4-21	暫准使用供應商申請表
PRO4-22(C)	物資採購會審表
PRO4-23(D)	機械設備購置及處理會審表



標準工作程序

表號：PRO4-01(B)

中國建築工程(香港)有限公司

供應商登記表

填報日期： 年 月 日 供應商編碼： _____
商戶名稱：英文： _____
中文： _____
商業證記號： _____ 註冊日期： _____
註冊地址： _____
聯絡地址： _____
電 話： _____ 傳 真： _____
網 址： _____ 電子郵箱： _____

公司性質：

1. ☐獨資經營 ☐合伙經營 ☐有限公司 ☐上市公司
☐其它 _____
2. 所屬母公司名稱： _____
附屬子公司名稱： _____
聯營公司名稱： _____

已發行資本：☐港幣壹佰萬元或以下 ☐港幣壹佰萬至壹仟萬元
☐港幣壹仟萬至壹億元 ☐港幣壹仟萬元以上

每年營業額：☐港幣壹佰萬元或以下 ☐港幣壹佰萬至壹仟萬元 ☐港幣壹仟萬至壹億元
☐港幣壹億元至拾億元 ☐港幣拾億元以上

業務性質及範圍： _____

主要客戶： 本地 % 國內 % 海外 % 合計 100%
客戶名稱： _____

主要貨源： 本地 % 國內 % 海外 % 合計 100%
廠方名稱： _____

總代理牌子： _____
代理牌子： _____
經銷牌子： _____

(有關上述經營牌子的產品，需填報附件Appendix I供應記錄)



標準工作程序

供應商登記表(續前)

組織架構:

1. 公司最高負責人: _____ 職位: _____
業務聯絡人: _____ 職位: _____
質量管理負責人: _____ 職位: _____
安全管理負責人: _____ 職位: _____
環保管理負責人: _____ 職位: _____
2. 員工人數: 行政管理人員 _____人 營業員 _____人 一般事務員 _____人
3. 公司架構表: 請附上公司架構表

設施設備:

1. 露天貨倉總面積: _____ 地點: _____
有蓋貨倉總面積: _____ 地點: _____
2. 門市部: 附屬: _____ 間 名稱: _____
聯營: _____ 間 名稱: _____
3. 檢定/測試用儀器/設備: _____

質量體系:

1. ISO 9000證書: ☐ 有(請附上副本) ☐ 無
2. 發貨前有否檢查品質: a) ☐ 廠方 ☐ 獨立檢驗公司 ☐ 本公司
b) ☐ 必定有(請附上文件) ☐ 經常 ☐ 甚少 ☐ 無
3. 檢定/測試貨品方法: _____

安全體系:

1. ISO 45001或認可證書: ☐ 有(請附上副本) ☐ 無
2. 違反安全法例: ☐ 有 ☐ 無
3. 安全計劃或措施: ☐ 有 (請附上文件) ☐ 無

環保體系:

1. ISO 14001證書: ☐ 有 (請附上副本) ☐ 無
2. 違反環保法例: ☐ 有 ☐ 無
3. 減少及回收包裝材料的計劃或措施: ☐ 有(請附上文件) ☐ 無

可持續發展(含ESG)政策/措施: _____

(如填寫位置不足, 請以附件方式提交)。

諮詢公司/客戶: _____ 諮詢人及聯絡方式: _____

收款銀行: _____

帳戶名稱: _____ 帳號: _____



標準工作程序

供應商登記表(續前)

須提交公司註冊資料副本：☐ Business Registration Certificate [商業登記証] 及
☐ Incorporation Form [法團成立表格] NNC1 或
☐ Annual Return [周年申報表] NAR1 及
☐ 銀行戶口證明

填報公司簽名印章：_____

公司專用 ☐ 接受 ☐ 否決

核對：_____ 覆核：_____ 批准：_____



Appendix I

Company : _____

Commodity under *Sole Agency / Agency / Authorized Distributor

Item	Product	Brand	Origin	Client	Project	Year	Remarks

Date : _____

Note : 1. Please provide job reference for the supply of commodity.
2. * Please delete as appropriate



標準工作程序

表號：PRO4-02(B)

供應商評估表(網上評估)

地盤名稱: _____ 地盤編碼: _____ 日期: _____

編碼	供應商	物資名稱	地盤評級					備註
			總評級	質量	安全 (註 2.1)	環保 (註 2.2)	服務	
			100%	50%	20%	10%	20%	
物料控制人員: _____ 地盤代表審核: _____ 地盤經理審批: _____								

註:

1. 評估辦法及準則:

- 供應商表現單項 / 總評級分為: A(優秀)、B(良好)、C(一般)、D(差劣), 如供應商進地盤供貨/服務期間違反現行法定的安全及環保要求而導致公司蒙受違例檢控等情況, 應將其總評級定為 D(差劣)。
- 由物料控制人員網上評級, 並必須評定 1 名 / $\leq 10\%$ A(優秀) 及 1 名 / $\leq 10\%$ C(一般) 的供應商。
- 如單項 / 總評級別為 D(差劣), 必須於備註欄說明原因, 經地盤代表審核後由地盤經理網上審批。

2. 安全及環保具體評級準則如下:

2.1 安全分以在地盤表現進行評級, 準則如下:

- 進入地盤的人士佩戴合規格的安全帽, 並提供合適的個人保護用具包括眼罩、口罩、聽覺保護器具、手套及安全鞋等。予該等人士, 及確保他們正確使用該等保護用具。
- 起重機械或吊重器具在依照建築地盤(安全)及工廠及工業經營(起重機械及裝置)規例的規定取得了有效之檢驗證明文件。
- 電動及手工具符合工廠及工業經營(電)及(木工機械)規例及建築地盤(安全)規例的要求。
- 運送、儲存及使用危險物料時符合工廠及工業經營(危險物質)、(可致癌物質)規例的要求, 並且在該容器上張貼正確標籤及即時呈交地盤該等物料的安全資料報告書。
- 地盤人員持有有效之“平安咭”(綠咭)。
- 如引致公司違例檢控, 應將其總評級定為 D(差劣)。

2.2 環保分在地盤表現進行評級, 準則如下:

a. 物料供應商:

- 有否回收、減少包裝物料(包括卡板)。
- 運輸車輛有否造成不必要的空氣污染(包括黑煙、塵埃)。
- 運輸車輛有否造成不必要的噪音。
- 運輸車輛離開地盤前有否洗車。
- 如引致公司違例檢控, 應將其總評級定為 D(差劣)。

b. 機械租賃公司:

- 機械有否排放黑煙。
- 機械有否發出不必要的噪音。
- 發電機等機械有否附加儲漏盤。
- 風機、風炮等有否貼上噪音標籤。
- 如引致公司違例檢控, 應將其總評級定為 D(差劣)。



標準工作程序

表號：PRO4-04

中國建築工程(香港)有限公司

TRANSMISSION 傳真稿	Date 日期：
To 至：	From 發文人：
Fax No 傳真號碼：	Tel No 電話號碼：
Subject 標題：投標報價邀請書	Total Pages 總共頁數： (including this page)
Message 內容：	

報價邀請書

本公司承建/投標之_____工程，特邀請 貴公司參與_____報價，
現隨函附上下列資料：

- ☐ 材料技術及品質要求
- ☐ 材料估計數量
- ☐ 預算批板及送樣板房日期
- ☐ 送貨日期
- ☐ 合約條款
- ☐ 安全及健康規則
- ☐ 環保要求

本工程截止報價日期為_____年_____月_____日正午時，報價單有效期至_____年_____月_____日；請詳閱有關文件，依以下方式遞交報價單，並註明物資部_____先生/小姐收。本公司有權選擇任何報價，逾時送交報價將不予考慮。多謝合作！

遞交報價單方式：

- ☐ 電郵或傳真報價單
- ☐ 把密封之正本報價單投放入物資部投標報價箱內

簽發：_____

物資部



表號	:	PRO4-05(D)
編號	:	

標準工作程序

採購員/組長
年 月 日

物資部副助理總經理

審批意見:

物資部總經理

註: 1. 此表格適用於HK\$1000萬以下的物資採購; 及單機價格HK\$100萬以下的機械設備/HK\$500萬以下的機電設備材料



標準工作程序

表號：PRO4-07

日期

訂購合約

第 頁共 頁

Date:

PURCHASE CONTRACT

Sheet of Sheets

致 TO	合約編號 Contract No: 工程編註 Project Ref: 物資申請表號:				
請按照本頁及背頁所列條件供應下述貨品與敝公司 Please supply and deliver the undermentioned goods in good order subject to the terms and conditions on the face and reverse side hereof.					
項目 Item	物料名稱 Description	數量 Quantity	單位 Unit	單價 Rate	金額 Amount

買方簽署並蓋章
Buyer Signature &
Co. Chop

賣方簽署並蓋章
Seller Signature &
Co. Chop



標準工作程序

表號: PRO4-09(D)

物資申請表

地盤名稱:

固定資產:

是否代購:

判頭名稱:

申請編號:

需工程公司审批:

制單日期:

收貨人及電話、電郵:

採購方案

預算超 50 万:

預算金額:

邀請報價供應商(如合約指明品牌必須填報):

備註:

序號	名稱/規格	品牌	產地	單位	計劃數量	計劃進貨日期	BQ 數量	已申請數量	備註
----	-------	----	----	----	------	--------	-------	-------	----

物資部簽收

:

地盤 QS

:

地盤申請人

:

物資部負責人

:

地盤經理

:

聯絡電話、電郵

:



標準工作程序

表號：PRO4-10(A)

地盤零星材料申請表

地盤名稱：

日期：

編號：

序號	材料名稱	規格	單位	數量	進貨日期	材料用途及使用位置	合約編號	項目

地盤經理：

總管審核：

申請人：

備註：定點名冊材料申請表必須由物料控制人員填寫“合約編號”及“項目”兩欄。



標準工作程序

地盤內部使用

表號：PRO4-11C

混凝土申請單

地盤名稱:

年 月 日

分項工程名稱	
混凝土使用部位	
按圖則計算用量 (m3)	
申請混凝土標號	
申請混凝土數量 (m3)	
申請混凝土使用時間	
上部份管工填寫，下部份物料控制人員填寫	
混凝土實際用量 (m3)	
混凝土損耗量 (m3)	
混凝土損耗率 (%)	
混凝土開槽時間	
混凝土收槽時間	
說 明	

總管審核:

QS:

管工申請:

註: 1. 本表格只供內部申請使用。

2. 柯打石矢需另行填寫石矢供應商指定的柯打表。



地盤鋼筋進場通知

供應商名稱: _____ 本通知編號: _____ 年 月 日

地盤名稱: _____ 交貨地址: _____

收貨人姓名及電話: _____ 訂購合約/供貨通知編號: _____

根據上述訂購合約/供貨通知，請貴司交付以下鋼筋到指定地點:

序號	鋼筋類別	規格	單位	數量	進貨日期	備 註

簽發: _____

地盤經理



地盤機電材料進場通知

供應商名稱: _____ 本通知編號: _____ 年 月 日
地盤名稱: _____ 交貨地址: _____
收貨人姓名及電話: _____ 訂購合約(P.O.)編號: _____

根據上述訂購合約，請貴司交付以下機電材料到指定地點:

P.O. 序號	機電材料描述	單位	數量	進貨日期	備 註

簽發: _____
地盤經理



實際應收總價

[illegible]

註：需註明有關材料需符合的工程合約GS、PS & BSEN等條文以及質量、安全及健康和環保要求。

製表：_____

PQS物資內派：_____

地盤經理：_____

物資部簽收：_____



標準工作程序



標準工作程序

表號：PR04-13(C)

零星材料採購比價單

編號：_____

地點名稱：

序號	是否為定點產品"√/x"	產品代碼	定點產品報價理由	規格及型號	單位	數量	單價	總價	按期交貨/其它	單價	總價	按期交貨/其它	單價	總價	按期交貨/其它
總金額：															
供應商表現評價：A(優秀)、B(良好)、C(一般)、D(差劣)															
產品評價 / 分析 (如適用)：															

建議：

物料控制人員
年 月 日

審批意見：

地點經理
年 月 日



標準工作程序

表表號：PRO4-14 (A)

標前採購協議申請單

致：物資部

年 月 日

投標工程名稱				
截標時間	年 月 日 時			
材料名稱	規格	數量	擬出標價格	交貨日期
附件：工程內容簡介 沒有 ☐ 有 ☐ ：_____				
材料規範(Specification) 沒有 ☐ 有 ☐ ：_____				
工程公司/部門 投標科意見	簽署：			
工程公司/部門 總經理意見	簽署：			
公司助理/ 副總經理意見	簽署：			
物資部採購 情況				



標準工作程序

表號: PRO4-15(B)

供應商評估匯總表 (網上評估)

報表日期:

供應商名稱:

供應商編碼:

供貨額:

採購員:

合約額:

地盤編碼	地盤名稱	物資名稱	總評級 100%	質量 50%	安全 20%	環保 10%	服務 20%	備註
地盤評級								
機電部評級(機電地盤適用)				(只需填總評級)				
物資部評級				(只需填總評級)				
綜合總評級								
去年綜合總評級								

評估結果:

繼續使用 ☐

觀察使用 ☐

警告 / 暫停投標 / 除名 ☐

採購員:

物資部副總經理:

物資部總經理:

寫字樓評估準則及辦法:

- 部門評級 / 綜合總評級別: A(優秀)、B(良好)、C(一般)、D(差劣)。
- 採購員及機電部(機電地盤適用)必須評定 1 名 / $\leq 10\%$ A(優秀) 及 1 名 / $\leq 10\%$ C(一般) 的供應商。
- 綜合總評級為 C(一般)的供應商應列為觀察使用, 連續兩年綜合總評級為 C(一般), 物資部應與供應商進行約談檢討。
- ≥ 2 個地盤評級為 D(差劣) / 綜合總評級為 D(差劣), 物資部應與供應商進行約談檢討, 並向供貨商發警告信或經物資部總經理決定暫停投標 / 除名。
- 房、土、基地盤: 地盤評分佔 60%、物資部佔 40%。
機電地盤: 地盤評分佔 60%、物資部佔 20%、機電部佔 20%。



Quotation Inquiry Sheet

Project :

Tender :

To	:		Date	:	
Attn.	:		Ref.	:	
Tel. No.	:		Fax No	:	
			Email	:	

We would like to invite you to quote for the following items:

1.	Subject	
2.	Scope of Offer	
3.	Tender Documents	Contents
4.	Contract Period	
5.	Tender / Quotation Return Date and Venue	
6.	Return Documents	
7.	Validity of Quotation	
8.	Remarks	
9.	Date of collection	
10.	Place of collection	

Please review your cost & offer us your best offer for this tender and submit your quotation by the stipulated date above. Should you have any query, please feel free to contact our Mr. xxx at xxx or Fax at xxx or email at xxx.

Issued by CSMEEL:

Received by : _____

Company Chop : _____

Authorized Representative

Date : _____



標準工作程序

表號: PRO4-17(A)

【供應商處分會審表】

供應商: _____

供應地盤: _____

供應產品/服務: _____

事故類別	安全因素	環保因素	質量因素	準期因素	違約因素	商業操守因素
嚴重						
一般						
詳細情況						

安全環保/質量技術/商務部:

已開展調查

是 ☐

否 ☐

已有調查報告並建議

是 ☐

否 ☐

物資部經辦人意見:

日期: _____

物資部分管建議:

一. 發出警告信 ☐

三. 從認可名冊中除名 ☐

二. 暫停投標資格

三個月 ☐

六個月 ☐

一年 ☐

四. 及/或其它:

物資部副/助理總經理簽署 日期: _____

物資部總經理決定:

物資部總經理簽署

日期: _____



表號：PR04-18(A)

供應商名稱

供應商地址

負責人名稱

*警告信/停止投標資格

有關：_____地盤之_____供貨合約(合約編號：_____)

貴公司在上述地盤供貨合約有下列 *未履行合約情況 / 欠佳表現：

上述 *未履行合約情況可構成違反合約條款與條件第____條的規定 / 欠佳表現 嚴重影響地盤工程進度，貴公司必須在____個工作天內（即在 年 月 日前）糾正上述所有事項，並須採取行動及步驟以維持合約條款與條件所要求的服務水平。

現對貴公司發出 *書面警告/ 並停止貴公司的投標資格為期____個月。望 貴司能在短期內作出改善，如在上述日期仍未作出任何滿意的補救措施，我司將有可能從認可供應商名冊中剔除貴司的投標資格，並將會根據合約條款與條件第6.(2)條的規定，對貴司採取相應行動。同時，我們保留一切追究權力。

此致

日期: 年 月 日

蓋章:

附件: (____頁)

*請刪去不適用



關於從認可供應商名冊中除名的通知

致: _____

貴公司長期以來在地盤的供貨質量、準期、安全、環保、服務、守約、商業操守、財政*等管理表現均不能滿足公司的要求，雖經公司多次出信書面警告，但仍沒有作出改善。

現公司決定採取進一步的行動，停止貴公司的投標資格，並從認可供應商名冊中除名，不得參與任何投標及進行工程，即時生效。

此致

日期: 年 月 日

蓋章:

* 請刪去不適用。



物資採購開標及議標記錄表

表號: PRO4-20 (C)

記錄:

次數	物資部	工程公司/部門	地盤	日期
參加開標人:				
參加議標人:				

註：1. 此表格適用於HK\$1000萬以上的物資採購；及單機價格HK\$100萬以上的機械設備/500萬以上的機電設備材料



暫准使用供應商申請表

供 應 商：_____ 供應商編號：_____

地 盤：_____

需採購物資：_____

基於以下原因又要滿足地盤的供貨要求，請批准在欠缺供應商登記情況下向該供應商訂購上述物資。

- 原 因：
- ☐ 與供應商初次合作，宜觀察表現，滿意後再辦登記手續
 - ☐ 供應商經營物資較特別屬判頭包工料，其他地盤訂購機會不大
 - ☐ 供應商為業主則師指定商號
 - ☐ 供應商堅持不填回我司之“供應商登記表”
 - ☐ 地盤零星自購物資

申請人

☐ 批准

☐ 不批准

採購員

物資部總經理

年 月 日

年 月 日



標準工作程序

標準工作程序

表號：PRO4-22(C)
編號：

物資採購會審表

地盤名稱： 首次開標日期： 最終開標第 次)日期：

規格及型號	單位	數量	投標成本	首次單價	最終單價	總價	首次單價	最終單價	總價	首次單價	最終單價	總價
總計												
供應商表現評價: A(優秀)、B(良好)、C(一般)、D(差劣)												
產品評價 / 分析:												
1. 符合主合約 / 地盤要求:												
2. 供貨期:												
3. 其他:												
建議:												
經辦人:										採購總額\$		
										盈/虧\$		

會審意見: 日期: 年 月 日

參加人簽名：	中建香港物資採購決策委員會					工程公司 / 部門	地盤
	主任	常務副主任	成員				

註: 1. 此表格適用於HK\$1000萬以上的物資採購; 及HK\$500萬以上的通電設備材料

機械設備購置及處理決策委員會

首次開標日期:

三澤田(大) 地盤調査

地盤名稱：

物資名稱：

[illegible]

會審意見

日期： 年 月 日

參加人簽名：	機械設備購置及處理決策委員會		工程公司 / 部門	地盤
	成員			
	主任	常務副主任		
			監督員	

註：1. 此表格適用於單機價格HK\$100萬以上的機械設備購置及處理
