

中國建築工程(香港)有限公司

標準工作程序

第三號：合約管理工作程序

編號：PRO/003

版本：第二版：C

日期：2021 年 5 月



標準工作程序

第二版：C

日期：2021.5

合約管理工作程序

工作程序修改記錄表

修改日期：2021.04

程序	修改內容簡要	新版
3.	1. 5.10.5 b：“質量技術部”更名為“質量科技部” 2. 修改標準工作程序批准人為公司總經理	第二版 C

批准：
公司總經理



目 錄

1. 目 的
2. 範 圍
3. 參考資料
4. 定 義
5. 作業方式
 - 5.1 業主合約處理
 - 5.2 業主指定分判商合約管理
 - 5.3 合約評審/進度會
 - 5.4 業主代表指令處理
 - 5.4.1 有文字記錄之業主代表指令
 - 5.4.2 缺乏文字記錄之業主代表指令
 - 5.5 工程變更的處理
 - 5.5.1 工程變更的確認
 - 5.5.2 工程變更的處理
 - 5.6 索賠管理
 - 5.7 地盤合約會議
 - 5.8 合約管理的審核
 - 5.9 分判商名冊制定，更新及分判商評估
 - 5.9.1 制定
 - 5.9.2 更新
 - 5.9.3 評估
 - 5.10 分判
 - 5.10.1 分判方案
 - 5.10.2 分判文件擬定
 - 5.10.3 發標及回標
 - 5.10.4 開標
 - 5.10.5 議標
 - 5.10.6 定判
 - 5.11 對分判商的處分
 - 5.11.1 處分情況



標準工作程序

第二版：C

日期：2021.5

合約管理工作程序

- 5.11.2 處分進行
- 5.11.3 處分準則
- 5.11.4 執行
- 5.11.5 恢復投標資格
- 5.11.6 對分判商處分的流程圖
- 5.12 工程結算
 - 5.12.1 分判合約結算
 - 5.12.2 總承包合約結算
 - 5.12.3 結算爭議
- 5.13 分判合約文件
 - 5.13.1 合約擬定及簽署
 - 5.13.2 合約保管和借閱
- 5.14 建築製品部合約管理
- 5.15 分判商進場時資質驗證
- 6. 處理施工圖修改/工作指令的流程圖
- 7. 附錄
 - 附錄一. 分判工程合約細則 (質量) 附則
- 8. 附表
 - PRO3-01 分判商登記表
 - PRO3-02 Sub-Contractor Registration Form
 - PRO3-03 Consultant Registration Form
 - PRO3-05(A) 分判商評估表
 - PRO3-06(A) 分判方案一覽表
 - PRO3-07(A) 標書記錄表
 - PRO3-08 分判工程招標書
 - PRO3-09 分判工程招標/合約簽收單
 - PRO3-10(A) 分判商報價分析表
 - PRO3-12 缺乏文字記錄之業主代表指令備忘錄
 - PRO3-13 警告信/停止投標資格
 - PRO3-14(A) 關於從分判商認可名冊中除名的建議(樣本)
 - PRO3-15 關於從認可分判商名冊中除名的通知

1. 目的

正確理解業主合約內容，及時解決合約問題並選擇合適的分判商，以確保業主合約能被正確的執行。

2. 範圍

適用於公司及工程公司之工程合約，包括土木、房屋、基礎、機電和建築製品工程等業主合約，業主指定分判商合約，分判合約管理工作。不適用於任何投標前需簽訂投標前分判協議(PRE-BID AGREEMENT)之分判項目。

3. 參考資料

3.1 《綜合管理手冊》

3.2 《質量管理手冊》

3.3 《安全及健康管理手冊》

3.4 《環境管理手冊》

3.5 《文件及資料管理工作程序》

4. 定義

參照《質量管理手冊》的名詞解釋。

4.1 業主合約：公司或工程公司和業主之間的合約。

4.2 業主指定分判商合約：公司或工程公司和業主指定分判商之間的合約。

4.3 分判合約：公司或工程公司和分判商之間的合約(不包括僱用專業工程顧問之協議)。

4.4 合約科：指公司工程部門負責合約管理之合約科和工程公司負責合約管理之合約部。

5. 作業方式

5.1 業主合約處理

5.1.1 在工程施工前，地盤需做好合約評審工作，如發覺有問題時，應以書面記錄及盡早澄清問題。

5.1.2 評審必須作書面記錄並由有關人員存檔。

5.2 業主指定分判商合約管理

5.2.1 收到業主指定分判商合約後，合約科負責審核分判合約內容是否與業主合約內容相符。若有問題須立即通知業主代表，討論有關問題，確保業主指定分判商能按業主合約要求完成。

5.2.2 審核無誤後，合約科負責填寫有關資料並聯絡業主指定分判商簽約後再

交工程公司/部門總經理或其授權人簽名。

5.2.3 合約正本交工程公司/部門文祕人員登記存檔。

5.2.4 工程公司/部門文祕人員負責影印合約副本交地盤，並要求簽收。

5.3 合約評審/進度會

5.3.1 工程公司/部門最少每季召開合約評審/進度會。

5.3.2 開會前各地盤經理應提交工程月報表。

5.3.3 會議上須檢討各地盤執行合約情況，評審工程進度，並討論地盤存在的問題和解決方法。

5.3.4 會議內容應記錄及存檔。

5.3.5 建築製品部之進度會由部門總經理負責按需要安排。

5.4 業主代表指令處理

5.4.1 有文字記錄之業主代表指令

- a. 地盤負責對業主代表發出之指令，是否有額外要求，技術可行性，進度影響，窩工和廢工情況等整體進行風險管理評審及保存記錄。
- b. 如發現有問題應立即與業主代表討論解決方法。如有需要，可向工程公司/部門有關負責人申請協助。

5.4.2 缺乏文字記錄之業主代表指令

- a. 地盤收到缺乏文字記錄之業主代表指令時，應立即通知地盤經理，由地盤經理按表格 PRO3-12《缺乏文字記錄之業主代表指令備忘錄》記錄存案。
- b. 地盤經理應與業主代表確定有關指令的詳情，並要求業主代表盡可能補發文件指令。
- c. 如業主代表決定不補發文件指令，地盤經理應記錄備案，並將備忘錄發放給業主代表簽收。
- d. 地盤經理須按上文 5.4.1 對業主指令作出評審。
- e. 如發現有問題應立即與業主代表討論解決方法。如有需要，可向工程公司/部門負責人申請協助。

5.5 工程變更的處理

5.5.1 工程變更的確認

- a. 工程變更的確認由地盤代表或項目經理負責和提出分析意見。
- b. 地盤經理審核並簽名作實。
- c. 對屬於和不屬於工程變更的業主代表指令應分別登記。
- d. 地盤工料測量師負責做表和更新資料、存檔。
- e. 地盤代表或項目經理負責訂定須要跟進的事項包括書信、相應施工安排、記錄等。

5.5.2 工程變更的處理

- a. 地盤工料測量師負責工程變更的價格處理工作。如與業主/業主代表有爭議，則由地盤經理負責統籌解決。工程變更的價格以每一單項計，於報業主/業主代表前按公司權限規定報工程公司/部門和商務部審核。
- b. 地盤代表或項目經理負責工程變更的工期延長處理工作。
- c. 價格或工期的處理，均應由地盤經理審核及簽字批准方可報給業主。
- d. 地盤工料測量師應對業主關於價格、工期的回覆登記、並及時通知地盤經理、地盤代表或項目經理回覆價格和報批價有無不同。如有不同，地盤經理應作出處理決定。
- e. 所有對工期處理的業主/業主代表信件都應抄報各自的工程公司/部門和商務部。
- f. 由於工程變更而發生廢工、廢料及其他費用等應由地盤代表或項目經理負責處理。地盤工料測量師負責登記、跟進及存檔。

5.6 索賠管理

- 5.6.1 索賠工作由地盤經理負責統籌及安排。
- 5.6.2 地盤代表或項目經理應建立索賠項目記錄表並訂定須要跟進的事項
- 5.6.3 根據實際發生情況，如有可以索賠的項目，應在合約規定時間內通知業主。
- 5.6.4 對要索賠的項目，要及時收集足夠的資料，報業主，。爭取業主在合約規定的時間內答覆和批准。
- 5.6.5 對業主/業主代表最終未能同意的索賠，如有充分理由及對地盤影響重大，可按合約要求進行申訴，如仲裁、調解等。由地盤經理提出申請，報工程公司/部門和商務部審核後，按公司相關程序審批。

5.7 地盤合約會議

- 5.7.1 地盤應每月安排一次合約工作會議，地盤經理、地盤代表、項目經理、地盤工料測量師等參加會議。
- 5.7.2 會議應檢討從業主收款情況，判頭糧款支付情況，工程變更處理和索賠等。
- 5.7.3 地盤工料測量師作會議記錄及存檔並抄送一份至工程公司/部門。

5.8 合約管理的審核

- 5.8.1 對地盤合約管理工作的審核由商務部聯同工程公司/部門合約科負責執行。

5.9 分判商名冊制定、更新及分判商評估

5.9.1 制定

- a. 所有分判商包括專業工程顧問，應填報表格 PRO3-01《分判商登記表》至 03《Consultant Registration Form》，由合約科工料測量師核對或補充資料。

- b. 工程公司/部門分管合約副/助理總經理應以分判商的質量、安全及健康、環境及保安管理表現、相關工程經驗及過去表現記錄等，決定該分判商是否列入分判商名冊內。

5.9.2 評估

- a. 地盤經理每半年負責在公司內網按表格 PRO3-05 1/2《分判商評估表》，進行分判商表現評估，全面評估該分判商在地盤之工作表現，包括質量、安全及健康、環境和保安管理等執行情況，合約科需定期按表格 PRO3-05 2/2《分判商評估表》的評估結果提出建議及跟進行動，對評分出現錯漏或偏差，需通知地盤於有關評估表上糾正或補充。
- b. 分判商表現評分由 3 部份組成，地盤分判商評分的平均分佔 60%、合約科評分佔 20%及工程公司/部門評分佔 20%，將分判商從優到劣劃分為 A、B、C、D 四級。

5.9.3 更新

- a. 合約科負責每年按表格 PRO3-05 2/2《分判商評估表》的評估結果，對各分判商在該年度之工作表現作全面覆核。
- b. 對於嚴重違反分判合約要求之分判商，各地盤經理可隨時向合約科報告，建議從名冊中除名。
- c. 經除名之分判商，一年內不得再申請進入名冊。特殊情況須由合約科或有關地盤經理書面報告，列明詳細原因，經工程公司/部門分管合約副/助理總經理簽名批准方可安排重新進入名冊，有關記錄需保存最少一年。

5.10 分判

5.10.1 分判方案

- a. 在合約前期階段，地盤應對工程合約做好合約風險評估及記錄，並與合約科共同草擬分判方案，建議分判的形式及邀請投標之分判商名單。如邀請分判商少於三間，需進行解釋說明並予以記錄。
- b. 分判方案按表格 PRO3-06《分判方案一覽表》由分管合約副/助理總經理、分管工程副/助理總經理、合約科相關人員、地盤經理共同參加會議審核，並由工程公司/部門總經理批准。
- c. 向分判商發出標書時，須附工程安全簡介清單，並要求分判商按表格 PRO3-09《分判工程招標/合約簽收單》簽收。
- d. 當工程進行中因特別原因或在分判進行期間，如有需要檢討或更改分判方案，需經工程公司/部門分管合約副/助理總經理審議後報工程公司/部門總經理批准。

5.10.2 分判文件擬定

- a. 分判招標文件由合約科工料測量師及地盤項目工料測量師共同擬定。
- b. 招標文件按表格 P03-07《標書記錄表》由工程公司/部門分管合約副/助理總經理簽名批准後才可正式發標。

- c. 十萬元以下之零星分判合約，可由地盤直接發標，分判商應從公司名冊內選擇。如該分判商不在名冊內，地盤定判前須向工程公司/部門分管合約副/助理總經理備案。分判合約由地盤負責擬定，合約須由地盤經理簽批，並將合約正本交合約科存檔，地盤只保留副本。

5.10.3 發標及回標

- a. 合約科工料測量師負責按表格 PRO3-08《分判工程招標書》發出招標文件。
- b. 分判商收到招標文件，須按表格 PRO3-09《分判工程招標/合約簽收單》簽回簽收單，簽收單由工料測量師存檔。
- c. 合約科工料測量師負責確認分判商是否參與投標及記錄各投標者回標時間，如經催促仍不按時回標者，應做好記錄。

5.10.4 開標

- a. 合約科工料測量師於收集各分判商之投標書後，應會同合約科相關人員一同開標，並按表格 PRO3-10《分判商報價分析表》匯總分判商報價，分析後進行確認。

5.10.5 議標

- a. 分析與確定報價後，由工程公司/部門分管合約副/助理總經理挑選分判商議價，基本原則是選擇入圍三標內之分判商，但亦可根據分判工程之大小、難度及風險而選擇較多分判商議價。當選擇分判商多於或少於三間，或議標後須另行增補分判商投標時，均需要特別記錄予以說明，並簽署確認。
- b. 與分判商議價由合約科工料測量師及地盤經理參加，質量要求高和施工技術難度大的分判項目可請工程公司/部門負責工程人員及質量科技部代表參加。
- c. 議價結果提交工程公司/部門分管合約副/助理總經理審核，批核按公司有關權限規定執行。

5.10.6 定判

- a. 定判會須按公司有關規定，由分判決策委員會及相關人員參加。
- b. 定判時應考慮該分判商過往表現，包括質量、安全及健康、環保和地盤保安、財政狀況、工程進度、材料管理和合作性等。
- c. 定判會決定中標分判商後，各參加人員於表格 PRO3-10《分判商報價分析表》簽名作實，並對表格進行編號。
- d. 合約科工料測量師負責通知各分判商定判結果及做分判合約。
- e. 所有分判資料由合約科工料測量師存檔至合約期及合約結算完成為止。

5.11 對分判商的處分

5.11.1 處分情況

- a. 在下列情況下，對分判商進行處分

- i. 違例檢控。在公司或代管的任何地盤發生違反安全、環保、入境及刑事等法例的檢控。追溯以事發日期為準。
- ii. 發生《標準工作程序》第 5 號《施工管理、檢驗和試驗工作程序》第 5.17 之嚴重質量事故；
- iii. 發生《標準工作程序》第 13 號《安全及健康管理程序》第 5.9.3b 之嚴重安全事故；
- iv. 發生引致嚴重環境污染，影響生態之嚴重環保事故；
- v. 分判商表現評估欠佳、工傷較多或引致發生違例檢控。

5.11.2 處分進行

- a. 分判商因違反有關法例而被定罪，由有關地盤、工程公司/部門按分判工程合約進行。
- b. 分判商發生嚴重事故，由工程公司/部門書面通知分判商，要求在十四日內提交書面解釋，說明事故的原因以及是否採取了合理可行的措施和事發後採取了哪些改善措施等。工程公司/部門在收到有關分判商的書面解釋後，組織有關部門召開會議進行評議，提出對分判商處分意見，由工程公司/部門書面通知分判商。
- c. 分判商表現評估欠佳、工傷較多或引致發生違例檢控等，由工程公司/部門提出對分判商處分的意見，並書面通知分判商，抄送安全環保部。
- d. 分判商發生嚴重事故，應考慮下列因素決定處分程度：
 - i. 傷亡人數或是否引致公眾人士受傷；
 - ii. 引致嚴重事故或財物嚴重損失；
 - iii. 對工作進度的影響；
 - iv. 對公眾人士的影響；
 - v. 是否由於分判商表現欠佳而導致事故；
 - vi. 是否分判商在同一地盤或其他地盤發生類似事故；
 - vii. 是否採取合理可行措施包括提供資料、指示、監督、訓練及個人防護設備予有關工人，並確保工作環境安全，或由於工人不遵守工作程序、指示或不使用分判商提供的個人防護用具；
 - viii. 視乎合約的大小及其複雜性。

5.11.3 處分準則

- a. 因分判商導致公司違反安全、環保及刑事等法例檢控，則按以下執行：
 - i. 若分判商連續滾存十二個月內違反上述法例導致公司被檢控定罪 1 宗，則予以書面警告。
 - ii. 若分判商連續滾存十二個月內違反上述法例導致公司被檢控定罪

- 2 宗，則暫停分判商投標一個月。
- iii. 若分判商連續滾存十二個月內違反上述法例導致公司被檢控定罪 3 宗，則暫停分判商投標三個月。
- iv. 若分判商連續滾存十二個月內違反上述法例導致公司被檢控定罪 4 宗及以上，則暫停分判商投標六個月。
- v. 工程公司/部門應按實際情況考慮各客觀因素作適當調整有關處分。
- vi. 若有關分判商在暫停投標資格期間，再被處分暫停投標資格，則可考慮同期執行和以最大暫停投標時間計算。
- b. 違反保安法例按以下執行：
 - i. 若分判商被地盤發現僱用非法入境者或非法勞工，則暫停投標六個月；
 - ii. 若分判商被警方發現在地盤僱用非法入境者或非法勞工，則暫停投標十二個月；
 - iii. 公司若因分判商僱用非法入境者或非法勞工而被檢控定罪，則將該分判商永久除名。
- c. 若發生嚴重事故，按以情況下執行
 - i. 若分判商及傷者/死者對於已發生的嚴重事故有同樣或相等的責任時，則會暫停分判商投標三個月。
 - ii. 若有關嚴重事故主要是由於分判商沒有採取有效及合理措施，則會暫停分判商投標六個月。
 - iii. 若有關嚴重事故完全是因分判商造成，則暫停分判商投標十二個月或以上。
 - iv. 若在十二個月內有關嚴重事故兩次及以上而完全是因分判商造成，則將分判商永久除名。
- d. 對工傷意外較多的分判商的處分
對在十二個月內工傷意外 5 宗或以上的分判商，應給予警告或以上處分，具體由工程公司/部門視情況決定。
- e. 按分判商表現評估結果建議對分判商進行處分。

5.11.4 執行


- a. 若有關分判商不願意接受上述處分或未能在規定的期限內提供書面解釋，將對分判商採取強制性措施，暫停投標時間最少為十二個月甚至除名。
- b. 如果有關分判商在違反有關法例或發生嚴重事故後仍未採取任何措施去改善其有關方面的表現，或十二個月內兩次及以上被暫停投標資格，將該分判商除名。
- c. 分判商若按本程序規定被暫停投標或除名，則其投標不管是否最有競爭力將不會被接受。
- d. 對業主指定分判商和專業分判商，可參照本工作程序執行。工程公司/部門應及時將有關情況通報業主，建議給予有關分判商適當處分。

情節較嚴重者，工程公司/部門應即時終止與其所簽定的分判合約。

5.11.5 恢復投標資格

- a. 分判商若因違反有關法例或定期評估欠佳而被暫停投標資格，到期恢復投標程序如下：
 - i. 若暫停投標資格二個月或以下，到期前 14 天必須由分判商向工程公司/部門書面申請，由有關地盤提供分判商改善情況報告，工程公司/部門根據其表現決定是否恢復投標資格。
 - ii. 若暫停投標資格三至五個月，到期前 14 天必須由分判商向工程公司/部門書面申請，由工程公司/部門安排分判商負責人親身向工程公司/部門和安全環保部解釋違例成因及承諾改正工作，由有關地盤提供分判商改善情況報告，工程公司/部門根據其表現決定是否恢復投標資格。
 - iii. 若暫停投標資格六個月或以上，到期前 1 個月必須由分判商向工程公司/部門書面申請，由工程公司/部門安排分判商負責人親身向工程公司/部門和安全環保部解釋違例成因及承諾改正工作，同時由工程公司/部門/安全環保部對分判商執行的管理體系情況進行查核，決定是否恢復投標資格。
- b. 分判商若因嚴重事故而被暫停投標，則需於到期前 1 個月向工程公司/部門申請恢復投標資格。經工程公司/部門轄下有關地盤評估其有關表現後，再經工程公司/部門組織各有關部門召開會議決定是否恢復分判商的投標資格，由工程公司/部門執行。

5.11.6 對分判商處分的流程圖

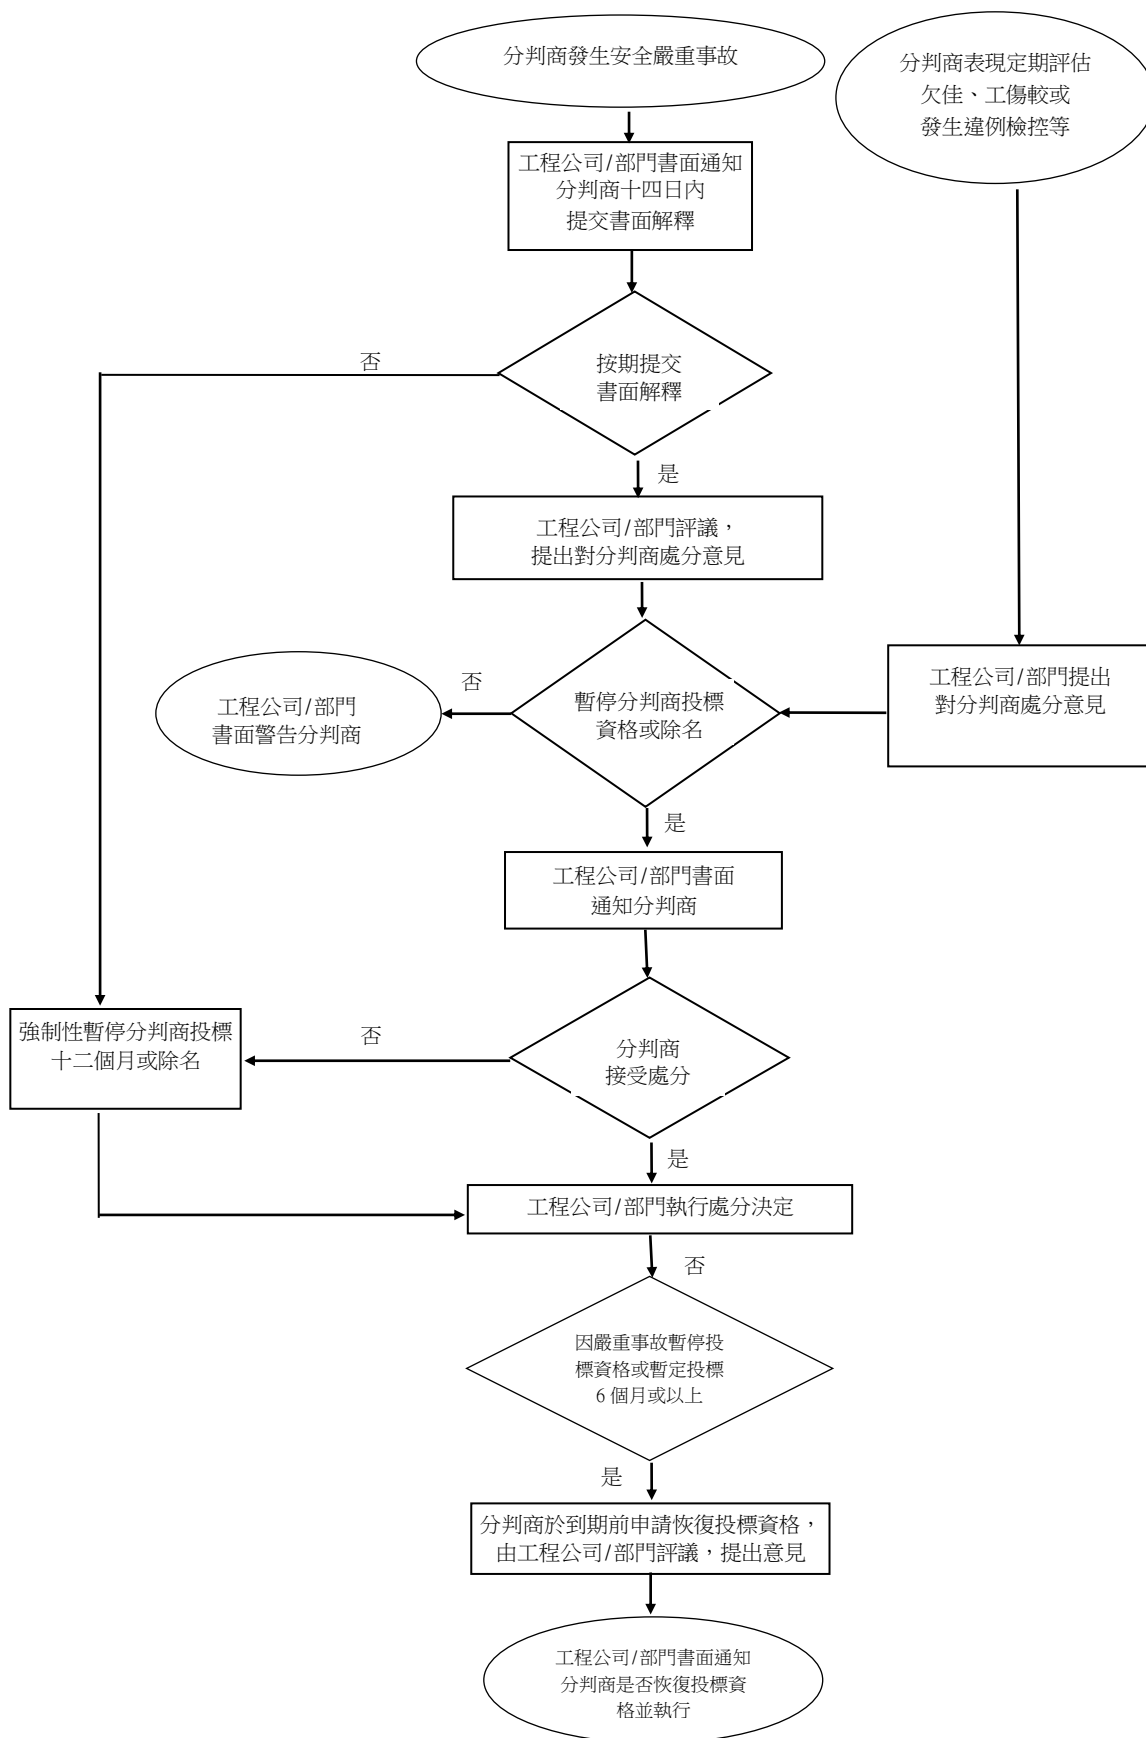

5.12 工程結算

5.12.1 分判合約結算

- a 正式結算前，地盤須準備好結算相關資料並制定初步結算方案，向合約科提出結算申請。
- b 結算初稿得到合約科審批同意後，方可與分判商簽署工程結算協議書。一般情況可由地盤經理代表公司與分判商授權人仕共同簽定分判工程結算協議書。

5.12.2 總承包合約結算

- a 正式結算前，地盤須準備好相關資料並制定初步結算方案，工程公司/部門分管商務副/助理總經理、總/高級合約經理、合約科相關人員、地盤經理及地盤合約管理人員共同參與審核初步結算方案。
- b 地盤正式提交結算報告予工程公司/部門，經總/高級合約經理、分管商務副/助理總經理，工程公司/部門總經理審批。結算報告得到審批後，由公司及業主授權人士共同簽署總承包結算協議書。

5.12.3 結算爭議

- a 如分判工程或總承包結算過程中發生較大爭議，地盤應及時匯報至工程公司/部門，由工程公司/部門視情況通報至商務部、中國建築國際集團有限公司有關部門，未經公司同意不得擅自對外發佈信息。
- b 結算爭議如可能涉及仲裁或訴訟，地盤須按公司有關程序申報，經工程公司/部門、商務部審核後，根據公司相關程序審批。
- c 如需聘請律師/顧問/專家等，地盤須按公司有關程序申報，經工程公司/部門、商務部審核後，根據公司相關程序審批。

5.13 分判合約文件

5.13.1 合約擬定及簽署

- a. 合約科工料測量師負責擬定分判合約，內容應包括附錄一.《分判工程合約細則(質量)附則》，一式兩份，交地盤經理及合約科審核後，工程公司/部門分管合約副/助理總經理批准。
- b. 分判商及工程公司/部門總經理簽署分判合約後，一份分判合約給分判商按 PRO3-09《分判工程招標/合約簽收單》簽回簽收單，其餘一份合約科存檔。另影印一份分判合約交地盤經理簽收。
- c. 分判合約由工程公司/部門文祕人員登記存檔。

5.13.2 合約保管和借閱

- a. 分判合約由工程公司/部門文祕人員登記存檔，包括借用及交還之登記。
- b. 分判合約在工程完工及結算完畢後，由工程公司/部門記錄後存入資料庫。




5.14 建築製品部合約管理

由建築製品部合同預算科參照有關的要求，制定建築製品部的《分判商名冊》，編制有關分判商的登記、更新、評估、分判和業主指令評審等工作程序。

5.15 分判商進場時資質驗證

有關要求詳見《施工管理、檢驗和試驗工作程序》第 5.8.4 項。

6. 處理施工圖修改/工作指令的流程圖

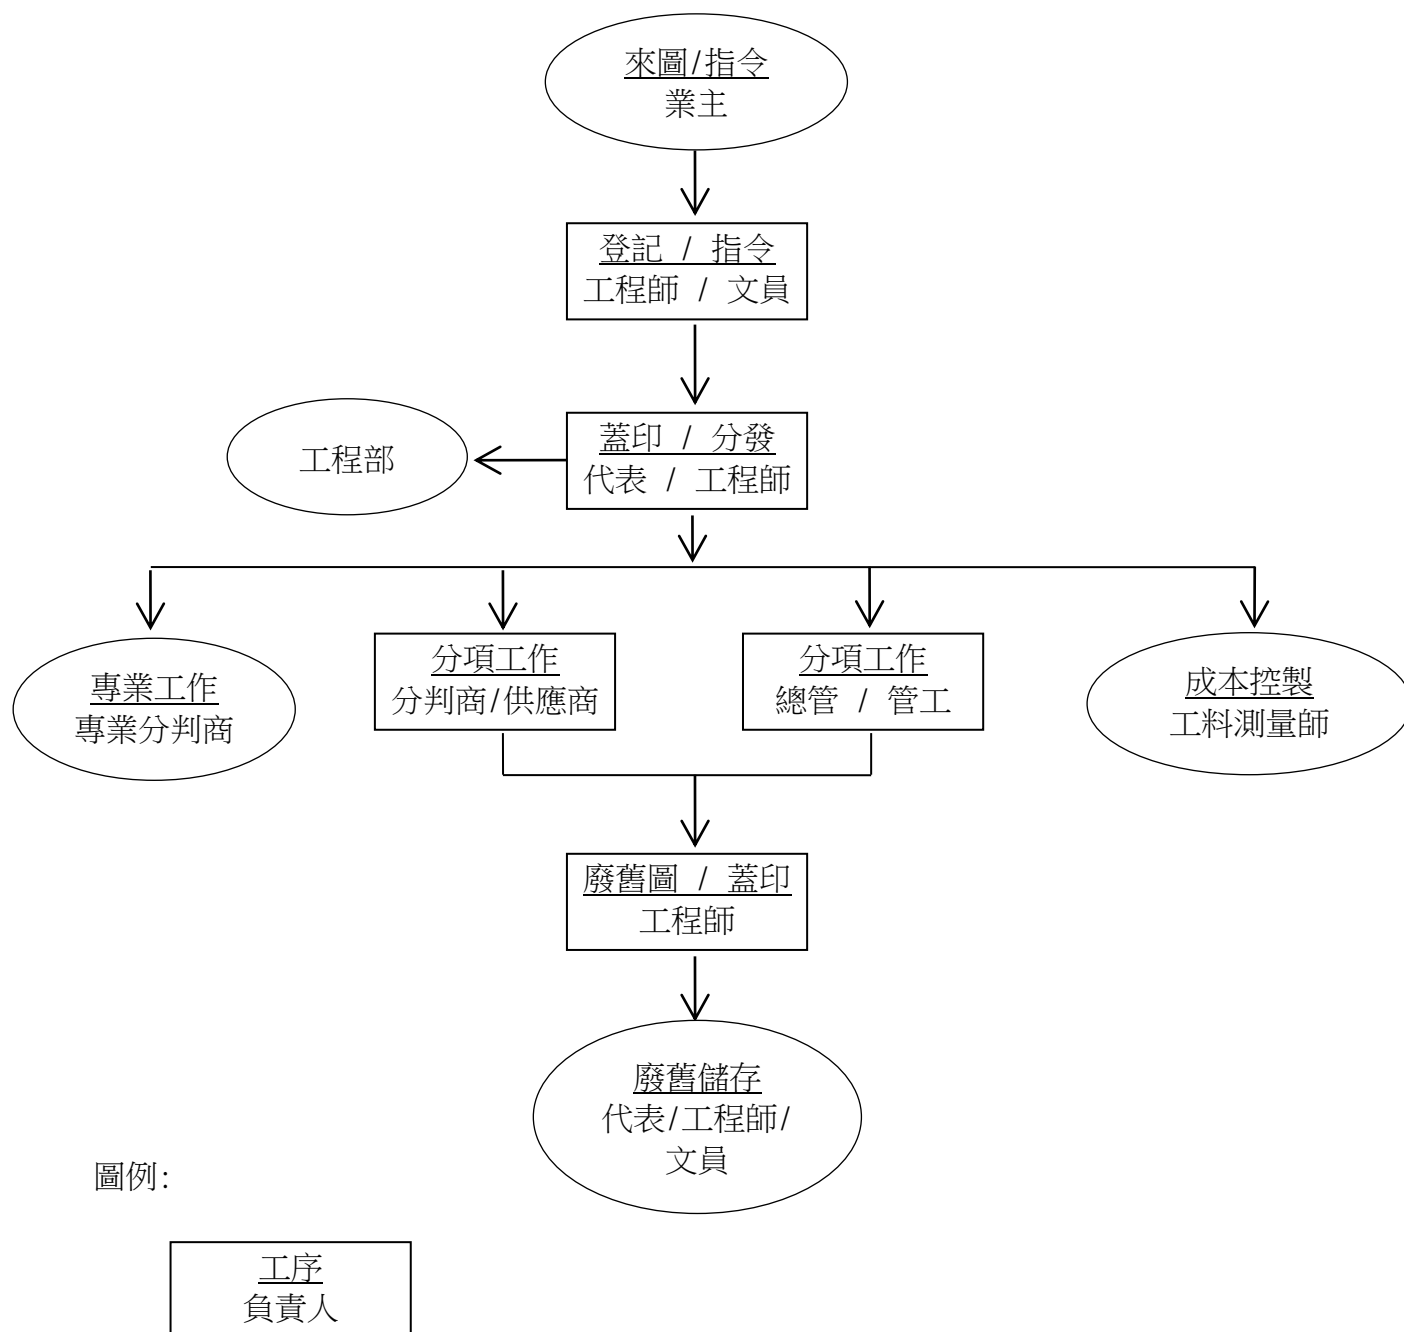



7. 附錄

附錄一. 《分判工程合約細則(質量)附則》

分判工程合約細則(質量)附則

1. 各分判項目需按指定格式及內容要求，呈報或提供資料編制分判工程質量交底卡；
2. 遵照地盤指示，進行各分判工程二次樣板工作；
3. 各工程分判商施工前需按地盤指示出席公司各有關質量管理體系培訓課程，並按地盤指示參加各分判工程質量交底會議。交底會完成後，分判商代理人需進一步向操作工人進行各有關分判工程之質量交底，並保留記錄；
4. 各分判工程需執行“三檢”制度，分判項目每次完工後需進行自檢驗收，確保符合要求。每分項工序交接時，需進行交接檢查，地盤進行覆檢，分判自檢需保留自檢驗收記錄；
5. 出席地盤安排之分判工程定期質量檢查；
6. 按地盤要求進行分判工程一行交一行之交接驗收，確保下一項分判工程交接後可順利展開；
7. 若分判商違反地盤有關對分判商的質量管理工作規定，本公司地盤有權向有關分判商徵收因處理有關工作所需之行政手續費，詳見下表：

事 項	第一次	第二次	第三次	以後每次
1. 沒有出席各項公司質量體系培訓課程。	每項 書面警告	收取行政費 每項 1,000 港元	收取行政費 每項 2,000 港元	收取行政費 每項 2,000 及匯報公司 有關工程部 門決定進一 步行動
2. 沒有出席交底會議				
3. 未有依時呈報有關分判項目之質量交底卡				
4. 未有保存向操作工人進行質量交底的記錄				
5. 沒有依期進行二次樣板工作				
6. 業主驗收前或地盤覆檢前分判商未有進行自檢驗收及保存記錄				
7. 沒有參加地盤安排之分判工程定期質量檢查				
8. 沒有進行分判工程一行交一行之交接驗收				

8. 附表



- PRO3-01 分判商登記表
- PRO3-02 Sub-Contractor Registration Form
- PRO3-03 Consultant Registration Form
- PRO3-05(A) 分判商評估表
- PRO3-06(A) 分判方案一覽表
- PRO3-07(A) 標書記錄表
- PRO3-08 分判工程招標書
- PRO3-09 分判工程招標/合約簽收單
- PRO3-10(A) 分判商報價分析表
- PRO3-12 缺乏文字記錄之業主代表指令備忘錄
- PRO3-13 警告信/停止投標資格*
- PRO3-14(A) 關於從分判商認可名冊中除名的建議(樣本)
- PRO3-15 關於從認可分判商名冊中除名的通知



分判商登記表

A. 公司基本資料

公司名稱：(中文) _____

(英文) _____

地址： _____

電話： _____ 傳真： _____

商業登記號碼： _____

承判工程類別： _____

預計每年能完成工程額港幣： _____

質量、安全健康、環保及保安系統：☐ 有 _____ (請註明標準) ☐ 無

1. 如何執行有關管理系統： 採用 a) ☐ 上述系統 b) ☐ 其他系統： _____
檢驗 a) ☐ 必定有 ☐ 經常 ☐ 甚少 ☐ 無
記錄 a) ☐ 必定有 ☐ 經常 ☐ 甚少 ☐ 無

2. 質量管理負責人：職位

姓名： _____

3. 安全管理負責人：職位

姓名： _____

4. 環境管理負責人：職位

姓名： _____

5. 保安管理負責人：職位

姓名： _____

公司負責人： (中文) _____ (職位) _____

(英文) _____ 電話/傳呼機： _____

第二負責人： (中文) _____ (職位) _____


(英文) _____ 電話/傳呼機： _____

簽署： (1) _____ 公司蓋章： _____

(2) _____ 日期： _____


本公司專用 ☐ 接受 ☐ 否決

核對： _____ 覆核： _____ 批准： _____



分判商登記表(續)


[illegible]



分判商登記表(續)

[illegible]

註：“√” = 是；“x” = 否



表格編號：PRO3-01(4/4)

分判商登記表(續)

D. 最近五年安全、環保及地盤保安被檢控記錄

[illegible]



Sub-Contractor Registration Form

A. Company Information

Sub-Contractor Name :

(English) _____

(Chinese) _____

Address _____

Telephone : _____ Facsimile : _____

Business Registration No. : _____

Scope Of Works : _____

Estimated Annual Turnover (HK\$) : _____

Quality, Safety & Health, Environmental and Security Management System :

☐ Yes _____ (Standard Ref. No.) ☐ No

1. Implementation : By ☐ Mentioned System ☐ Other System : _____

Inspection ☐ Always ☐ Frequent ☐ Rare ☐ None

Record ☐ Always ☐ Frequent ☐ Rare ☐ None

2. Quality In Charge : Post _____ Name : _____

3. Safety In Charge : Post _____ Name : _____

4. Environmental Management In Charge : Post : _____ Name : _____

5. Security Management In Charge : Post : _____ Name : _____

Representative : (Chinese) _____ (Post) _____

(English) _____ Tel/Fax : _____

2nd Representative : (Chinese) _____ (Post) _____

(English) _____ Tel/Fax : _____

Signature : (1) _____ Company Stamp : _____

(2) _____ Date : _____


=====

For Company Use

☐ Accept


☐ Reject

Check : _____ Review : _____ Approve : _____



Sub-Contractor Registration Form(cont'd)


[illegible]



Sub-Contractor Registration Form(cont'd)

[illegible]

Remarks : “√” = Yes ; “x” = No



表格編號：PRO3-02(4/4)

Sub-Contractor Registration Form(cont'd)

D. Projects Safety, Environmental and Immigration Legal Prosecution recorded in the past 5 years	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]



標準工作程序

表格編號: PRO3-03(1/2)

Consultant Registration Form

A. Company Information

Consultant Name :

(English) _____

(Chinese) _____

Address : _____

Telephone : _____ Facsimile: _____

Professional Qualification of Key Staff :

Business Registration No. : _____

Scope of Works : _____

Estimated Annual Turnover (HK\$) : _____

Quality Environmental Management System : ☐ Yes _____ (Standard ref. No.) ☐ No

1. Implementation : By ☐ Mentioned System ☐ Other System : _

Inspection ☐ Always ☐ Frequent ☐ Rare ☐ None

Record ☐ Always ☐ Frequent ☐ Rare ☐ None

2. Quality In Charge : Post _____ Name : _____

3. Safety In Charge : Post _____ Name : _____

4. Environmental Management In Charge :

Post : _____ Name : _____

Representative : (Chinese) _____ (Post) : _____

(English) _____ Tel/Fax : _____

Representative : (Chinese) _____ (Post) : _____

(English) _____ Tel/Fax : _____

Signature : (1) _____ Company Stamp : _____

(2) _____ Date : _____


=====

For Company Use

☐ Accept

☐ Reject

Check : _____ Review : _____ Approve : _____



FORM : PRO3-03(2/2)

Consultant Registration Form(cont'd)

B. Projects completed/in progress in the past 5 years

[illegible]

Remarks : “√” = Yes ; “x” = No



標準工作程序

表格編號：PRO3-05(A) 1/2

分判商評估表

地盤：_____ 分判合約號：_____ 分判商：_____

分判項目：_____ 評估期：_____

此部份由地盤按分判商表現每6個月填寫一次

項目	內容	評分準則	最高 評分	得分 (NA-不 適用)	
質量 表現 (20 分)	施工方案呈報	(3~0) 3-配合地盤，資料齊備 ~ 0-拖延，資料不足	3		
	業主投訴	(3~0) 3-沒有 ~ 0 較多	3		
	現場質量	(3~0) 3-很少修補 ~ 0-大量修補	3		
	驗收表現	(3~0) 3-一次收妥 ~ 0-頻需翻驗	3		
	跟進改善情況	(3~0) 3-積極改善 ~ 0-毫無跟進	3		
	合作性	(3~0) 3-高 ~ 0-低	3		
	參與交底及培訓	(2~0) 2-出席率高 ~ 0-出席率低	2		
材料管理 (5分)	到貨及審批	(2~0) 2-準時無礙，資料充足 ~ 0-影響工期，資料不足	2		
	現場管理	(2~0) 2-材料合格、妥善擺放 ~ 0-凌亂	2		
	材料標記	(1~0) 1-標記充足正確 ~ 0-毫無跟進	1		
安全表現 20 分	特別工序施工安全方案呈批內容表現	(4~0) 4-優 ~ 0-劣	4		
	合作性、對員工監管	(4~0) 4-優 ~ 0-劣	4		
	參與交底、培訓	(4~0) 4-出席率高 ~ 0-出席率低	4		
	跟進風險評估改善	(4~0) 4-積極改善 ~ 0-毫無跟進	4		
	工傷意外	0 宗 - 優(4)、1 宗 - 良(3)、2 宗 - 中(2)、3 宗 - 可(1)、4 宗或以上 - 劣(0))	4		
環保 表現 10 分	環保措施遵守情況	合作性、跟進改善積極性、對員工表現監管 (5~0) 5-優 ~ 0-劣	5		
	完成合約環保要求	(5~0) 5-優 ~ 0-劣	5		
保安表現 5 分	保安措施遵守情況	合作性、跟進改善情況 (2~0) 2-優 ~ 0-劣	2		
	遵守防止非法勞工規定	3-沒有發現聘用黑工 ~ 0-發現聘用黑工	3		
工程進度 (30分)	人手	(4~0) 4-隨時配合地盤需要 ~ 0-經常不足	4		
	設備及工具	(5~0) 5-嶄新齊備 ~ 0-殘舊缺乏	5		
	施工方案水準	(3~0) 3-內容齊備，一次批准 ~ 0-資料不足，多次審批	3		
	按照方案施工	(5~0) 5-準確依照 ~ 0-隨便改變	5		
	技術含量	(3~0) 3-高 ~ 0-低	3		
	工作經驗	(5~0) 5-熟練，操作自如 ~ 0-不足及生手	5		
	時間及進度	(5~0) 5-完全配合，經常提早 ~ 0-毫不配合，極慢	5		
履行合同 10 分	提出不合理索賠	(3~0) 3-無 ~ 0-頻頻要求	3		
	履行合作性	(2~0) 2-高 ~ 0-低	2		
	工人支薪情況	(3~0) 3-準期 ~ 0-頻頻拖期	3		
	流動資金情況	(2~0) 充足，有良好信譽 ~ 0-缺乏，名聲差	2		
嚴重事故及違例情況	嚴重事故(宗)	安全違例檢控(宗)	環保違例檢控(宗)	保安違例檢控(宗)	
地盤評語或特別事項:			累計得分		
				評分:	

註: 此表已上載公司內網，由地盤經理填報



標準工作程序

表格編號：PRO3-05(A) 2/2

分判商評估表(網上跟進)

分判商名稱：_____ 評估期：_____

序號	地盤名稱	質量 (20 分)	材料 (5 分)	安全 (20 分))	環保 (10 分)	保安 (5 分)	進度 (30 分)	合同 (10 分)	合計	嚴重事故 (宗)	安全違例 檢控	環保違例 檢控	保安違例 檢控
1													
2													
3													
地盤平均分									(A)	總數:			
合約科評分									(B)				
工程公司/部門評分									(C)				
評估結果: a 未有違例檢控及財務問題、或總均分 60 分或以上，合格:保留分判商名冊內 b 總均分低於 60 分高或等於 50 分:應向分判商發出警告信 c 任何安全或環保違例檢控 1 宗或以上、或工傷意外四宗或以上及低於 60 分、或任何項目零分、或低於 50 分:最少暫停投標 3 個月 d 保安違例檢控 1 宗或以上、或總評分低於 40 分:從名冊中除名一年內不得再申請入名冊內													
合約科意見: ☐ 停止投標3個月/除名/發警告信 ☐ 繼續試用/停止投標改為__個月 ☐ 財務狀況未符合公司要求，停止投標至符合為止 ☐ 其他 _____ 原因 _____						工程公司/部門意見: ☐ 同意 ☐ 不同意 ☐ 其他 _____ 原因 _____					總評分:_____ (A×60%+B×20%+C×20%) 級別: _____		
合約科簽名: _____ 日期: _____						分管合約副/助理總經理: _____ 日期: _____							

備註

1. 違例檢控由安全環保部負責覆核；
2. 分判商履行合同內有關財務狀況，由工程公司/部門及會計部負責及跟進；
3. 工程公司/部門應考慮分判商施工人數，獲判地盤總數量等，以決定停止分判商投標之期限；
4. 級別:A(優)≥85 分； B(良)75 至 <85 分； C(可)60 至 <75 分； D(劣)<60 分；
5. 各地盤、合約科及工程公司/部門評分匯總審批後，交回合約科處理及跟進。

(註: 此表已上載公司內網，各工程公司/部門合約科需定期於內網上查閱跟進評估結果，如填報有錯漏，需通知有關地盤更正)



標準工作程序

表格編號：PRO3-06(A)

分判方案一覽表

合約號：_____

地 盤：_____

日 期：_____


工 類：_____

分判項目	分判方式	附註	公司中標後擬選以下分判商參與落標						
			1	2	3	4	5	6	7

製表人： 覆核人： 工程公司/部門分管工程副/助理總經理： 工程公司/部門分管合約副/助理總經理： 地盤經理：

工程公司/部門總經理會議批准日期：

工程公司/部門總經理簽署：



標書記録表

[illegible]



_____ 公司/先生

分判工程招標書

本公司承建之 _____ 工程，特邀請貴公司參與 _____ 分判工程投標，現隨函附上有關資料，包括分判工程合約及工程數量書等。請於落價前到地盤查閱圖則，並與地盤 _____ 經理商談工程質量要求、工期及其他細節。地盤聯絡電話：_____。

本工程截止投標日期為200__ 年 __ 月 __ 日正午十二時正，請詳閱有關文件，並填妥報價單、分判合約內有關乙方資料及投標信封，用投標信封封好，依時送還本公司合約部/科 _____ 先生，若逾時送還，標價將不予考慮。本公司有權選擇任何標價。

請封密標書，多謝合作！

合約科
年 月 日



分判招標書/合約簽/安全簡介簽收單


茲收到 _____ 工程 _____ 分判招標書/合約書及工程安全
簡介清單一份，合約編號 _____，包括以下文件。

“文件清單內容”

簽收人：

公 司(蓋章)：

日 期：



分判商報價分析表

定判編號: _____

工程名稱(No.):

表格編號:PRO3-10(A)

序 號	投標人	分 判 工 程 B Q 總 價 H K \$											
		開標總價		議價後總價									
分 判 決 策 委 員 會													
	主任	副主任	成員	成員	成員	成員	成員	成員	成員	監督員	工料測量師	地盤經理	日期
參加開標人													
參加議價人													
參加定判人													
定判結果													



缺乏文字記錄
之
業主指令備忘錄

單位：

日期：

業主代表姓名：

職位：

業主指令：

地盤經理簽名：_____

年 月 日



警告信/停止投標資格*

致: _____

根據公司《合約管理工作程序》的要求，每個工程項目每年最少兩次對貴公司的質量、材料、安全、環保、保安、工程進度、合約、財政等表現進行評估。

貴公司在 _____ 地盤，_____ 年上/下*半年進行的分判商表現評估中，在質量、材料、安全、環保、保安、工程進度、合約、財政*等方面上表現未能達到地盤綜合管理合格標準，現對貴公司發出:書面警告*，並停止貴公司的投標資格為期_____個月*，希望貴公司能在短期內作出改善，否則本公司將有可能從認可分判商名冊中剔除貴司的投標資格。

此致

工程公司/部門 *: _____

日 期: 年 月 日

工程公司/部門*蓋章:

*請刪去不適用。



關於從分判商認可名冊中除名的建議(樣本)

XX 工程公司/部門總經理:

由於分判商 XXX 工程有限公司在 XXX 工程地盤的施工質量差劣，進度達不到施工要求，對公司造成了很大的經濟及聲譽損失。地盤及公司多次給予機會改進及提出書面警告，但始終沒有改善達到公司要求。

現建議將此分判商從認可分判商名冊中除名，取消其投標資格。

合約科: _____ 日期: _____

=====

回覆*: ☐ 同意 ☐ 不同意，原因: _____

工程公司/部門總經理: _____

日 期: _____

*: 請於適當位置加上✓。



關於從認可分判商名冊中除名的通知

致: _____

貴公司長期以來在地盤的質量、材料、安全、環保、保安、工程進度、合約、財政*等管理表現均不能滿足公司的綜合管理要求，雖經公司多次出信書面警告，但仍沒有作出改善。

現公司決定採取進一步的行動，停止貴公司的投標資格，並從認可分判商名冊中除名，不得參與任何投標及進行工程，即時生效。

此致

工程公司/部門: _____

日 期: 年 月 日

工程公司/部門蓋章:

*: 請刪去不適用。
